

令和5年度 第2回専門部会

特定事業計画の定量的な評価結果

Barrier Free



特定事業計画の事業進捗管理

特定事業計画の事業進捗管理

さいたま市では、バリアフリー基本構想の取組を段階的・継続的に進め、必要な改善を加えていくスパイラルアップの一環として、事業者と連携して特定事業計画の進捗状況を年に一回確認している。

令和4年度3月 さいたま市バリアフリー基本構想 改定

改定した基本構想に基づき、特定事業計画の事業進捗状況の確認して、事業者にも水平展開していくことにより、バリアフリー化の推進を図る。

特定事業計画について

- バリアフリー法の規定に基づき、基本構想作成後に各事業者の皆様は特定事業計画（具体の事業内容や実施時期等を定めた実施計画）を作成し、これに基づいて事業を実施するもの。

👉 基本構想の特定事業計画に基づき、事業者の皆様と事業実施状況を定期的に確認していくことで、計画的なバリアフリーの推進に役立てて頂く。

特定事業計画の事業進捗管理

令和4年3月 さいたま市バリアフリー基本構想 改定
～特定事業の設定～

【令和4年度】

基本構想改定後、令和3年度の特定事業の実施状況の調査

特定事業計画のデータベース化

特定事業計画のとりまとめ

【令和5年度】

事業者への事業内容の確認、令和4年度の特定事業の実施状況の調査

令和4年度の特定事業の進捗状況の取りまとめ

現在

【令和4年度末】全事業に対する事業進捗率

事業進捗率 = (完了事業 + 継続事業) ÷ 計画数(※)

(※)計画数とは、特定事業計画から「実施を見送った事業」を差し引いたもの

完了事業：整備の実施、設備の導入等により完了した事業

①**全事業** 継続事業：ノンステップバスの導入や職員の教育など、毎年度事業が進捗しても「完了」とはならず継続して行う事業

上段:総事業数 中段:完了・継続中の事業数 下段:事業進捗率(中段/上段)	重点整備地区						総計
	大宮	北浦和	浦和	さいたま 新都心・ 北与野	武蔵浦和	岩槻	
公共交通特定事業	16 13 81%	12 11 92%	5 5 100%	21 16 76%	7 5 71%	21 17 81%	82 67 82%
道路特定事業	27 17 63%	17 3 18%	21 12 57%	24 11 46%	17 3 18%	13 7 54%	119 53 45%
その他事業 (補完経路)	7 3 43%	10 2 20%	9 2 22%	6 2 33%	3 0 0%	5 0 0%	40 9 23%
その他事業 (歩行者デッキ)	0 0 -	0 0 -	0 0 -	19 17 89%	6 0 0%	0 0 -	25 17 68%
その他事業 (バリアフリー経路共通)	1 1 100%	2 2 100%	2 2 100%	6 6 100%	7 7 100%	5 5 100%	23 23 100%
交通安全特定事業	3 3 100%	3 3 100%	3 3 100%	7 7 100%	4 4 100%	3 3 100%	23 23 100%
建築物特定事業	218 106 49%	126 74 59%	210 99 47%	113 66 58%	162 114 70%	123 81 66%	952 540 57%
都市公園特定事業	0 0 -	3 0 0%	0 0 -	1 1 100%	0 0 -	0 0 -	4 1 25%
その他事業	7 5 71%	4 3 75%	9 7 78%	0 0 -	0 0 -	0 0 -	20 15 75%
教育啓発特定事業							7 7 100%
総計	279 148 53%	177 98 55%	259 130 50%	197 126 64%	206 133 65%	170 113 66%	1,295 755 58%

重点整備地区全体で、事業進捗率は**58%**。
公共交通特定事業、交通安全特定事業などの進捗率が高い。

【令和4年度末】 継続事業を除いた事業進捗率(主にハード整備事業)

事業進捗率 = 完了事業 ÷ 継続事業を除く計画数(※)

(※)計画数とは、特定事業計画から「実施を見送った事業」を差し引いたもの

②継続事業を除いた事業

上段:総事業数 中段:完了事業数 下段:事業進捗率(中段/上段)	重点整備地区						総計
	大宮	北浦和	浦和	さいたま 新都心・ 北与野	武蔵浦和	岩槻	
公共交通特定事業	2 0 0%	3 2 67%	0 0 -	7 6 86%	2 2 100%	8 8 100%	22 18 82%
道路特定事業	24 14 58%	15 1 7%	16 7 44%	22 9 41%	17 3 18%	12 6 50%	106 40 38%
その他事業 (補完経路)	6 2 33%	8 0 0%	7 0 0%	5 1 20%	3 0 0%	5 0 0%	34 3 9%
その他事業 (歩行者デッキ)	0 0 -	0 0 -	0 0 -	3 2 67%	6 0 0%	0 0 -	9 2 22%
その他事業 (バリアフリー経路共通)	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -
交通安全特定事業	0 0 -	0 0 -	0 0 -	3 3 100%	1 1 100%	1 1 100%	5 5 100%
建築物特定事業	137 28 20%	84 32 38%	136 37 27%	75 28 37%	87 39 45%	65 23 35%	584 187 32%
都市公園特定事業	0 0 -	3 0 0%	0 0 -	1 1 100%	0 0 -	0 0 -	4 1 25%
その他事業	2 1 50%	2 1 50%	7 5 71%	0 0 -	0 0 -	0 0 -	11 7 64%
教育啓発特定事業							0 0 -
総計	171 45 26%	115 36 31%	166 49 30%	116 50 43%	116 45 39%	91 38 42%	775 263 34%

重点整備地区全体で、事業進捗率は**34%**。
全事業と同様に、公共交通特定事業、交通安全特定事業などの進捗率が高い。

【令和4年度末】年度別完了事業数(継続事業を除く)

【集計対象】 令和2年度以前完了事業：旧基本構想での実績
 令和3～4年度完了事業：改定基本構想での進捗

③継続事業を除く完了した事業

上段:令和2年度までの完了事業数 中段上:令和3年度の完了事業数 中段下:令和4年度の完了事業数 下段:継続事業を除く完了事業数	集計年度	重点整備地区						総計
		大宮	北浦和	浦和	さいたま 新都心・ 北与野	武蔵浦和	岩槻	
公共交通特定事業	～R02	0	2	0	5	2	7	16
	R03	0	0	0	1	0	1	2
	R04	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	2	0	6	2	8	18
道路特定事業	～R02	13	1	7	8	3	6	38
	R03	0	0	0	1	0	0	1
	R04	1	0	0	0	0	0	1
	計	14	1	7	9	3	6	40
その他事業 (補完経路)	～R02	2	0	0	1	0	0	3
	R03	0	0	0	0	0	0	0
	R04	0	0	0	0	0	0	0
	計	2	0	0	1	0	0	3
その他事業 (歩行者デッキ)	～R02	0	0	0	2	0	0	2
	R03	0	0	0	0	0	0	0
	R04	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	2	0	0	2
その他事業 (バリアフリー経路共通)	～R02	0	0	0	0	0	0	0
	R03	0	0	0	0	0	0	0
	R04	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0
交通安全特定事業	～R02	0	0	0	3	1	1	5
	R03	0	0	0	0	0	0	0
	R04	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	3	1	1	5
建築物特定事業	～R02	2	0	2	16	32	17	69
	R03	21	28	22	6	6	4	87
	R04	5	4	13	6	1	2	31
	計	28	32	37	28	39	23	187
都市公園特定事業	～R02	0	0	0	1	0	0	1
	R03	0	0	0	0	0	0	0
	R04	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	1	0	0	1
その他事業	～R02	1	1	5	0	0	0	7
	R03	0	0	0	0	0	0	0
	R04	0	0	0	0	0	0	0
	計	1	1	5	0	0	0	7
教育啓発特定事業	～R02							0
	R03							0
	R04							0
	計							0
総計	～R02	18	4	14	36	38	31	141
	R03	21	28	22	7	6	4	90
	R04	6	6	13	12	3	10	32
	計	45	36	49	50	45	38	263

重点整備地区全体で令和2年度までに完了
 していた事業数は141件、令和3年度の
 完了は90件、令和4年度の完了は32件。
 建築物特定事業の完了事業数が多く、改定
 基本構想において大宮、北浦、浦和駅地区に
 おいて新たに位置付けられたことが要因と
 なっている。

【令和4年度末】令和7年度までの実施を予定した事業の進捗率(着手済みを含む)

【集計対象】 短期事業：実施時期を令和7年度までとしている事業
 継続事業：過去から継続している、今後も継続的に取り組む事業

④短期・継続事業で継続中・完了した事業

上段:総事業数 中段:完了・継続中事業数 下段:事業進捗率(中段/上段)	重点整備地区						総計
	大宮	北浦和	浦和	さいたま 新都心・ 北与野	武蔵浦和	岩槻	
公共交通特定事業	14 13 93%	9 9 100%	5 5 100%	15 10 67%	5 3 60%	14 10 71%	62 50 81%
道路特定事業	6 4 67%	10 2 20%	10 5 50%	2 2 100%	1 0 0%	1 1 100%	30 14 47%
その他事業 (補完経路)	2 1 0	2 2 0	3 2 0	1 1 0	0 0 0	0 0 0	8 6 75%
その他事業 (歩行者デッキ)	0 0 -	0 0 -	0 0 -	16 15 94%	0 0 -	0 0 -	16 15 94%
その他事業 (バリアフリー経路共通)	1 1 100%	2 2 100%	2 2 100%	6 6 100%	7 7 100%	5 5 100%	23 23 100%
交通安全特定事業	3 3 100%	3 3 100%	3 3 100%	4 4 100%	3 3 100%	2 2 100%	18 18 100%
建築物特定事業	125 97 78%	88 68 77%	111 83 75%	49 44 90%	82 79 96%	71 63 89%	526 434 83%
都市公園特定事業	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -
その他事業	5 4 80%	3 2 67%	3 2 67%	0 0 -	0 0 -	0 0 -	11 8 73%
教育啓発特定事業							7 7 100%
総計	156 123 79%	117 88 75%	137 102 74%	93 82 88%	98 92 94%	93 81 87%	701 575 82%

重点整備地区全体で、事業進捗率は82%。
 短期・継続事業に着目すると、進捗率は全事業(58%)よりも大幅に高くなる。

【令和4年度末】重点整備地区ごとの年度ごとの事業進捗状況


完了事業：整備の実施、設備の導入等により完了した事業

継続事業：ノンステップバスの導入や職員の教育など、毎年度事業が進捗しても「完了」とはならず継続して行う事業

大宮地区 年度別完了・継続事業数

年度別完了・継続事業

上段:単年度事業数 中段:累計事業数 下段:事業進捗率	総事業数	令和2年度 以前	各年度末時点				
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
公共交通特定事業	16	11 69%	0 69%	2 81%			
道路特定事業	27	16 59%	0 59%	1 63%			
その他事業 (補完経路)	7	3 43%	0 43%	0 43%			
その他事業 (歩行者デッキ)	0	0	0	0			
その他事業 (バリアフリー経路共通)	1	1 100%	0 100%	0 100%			
交通安全特定事業	3	3 100%	0 100%	0 100%			
建築物特定事業	218	80 37%	21 46%	5 49%			
都市公園特定事業	0	0	0	0			
その他事業	7	5 71%	0 71%	0 71%			
総計	279	119 43%	21 50%	8 53%			

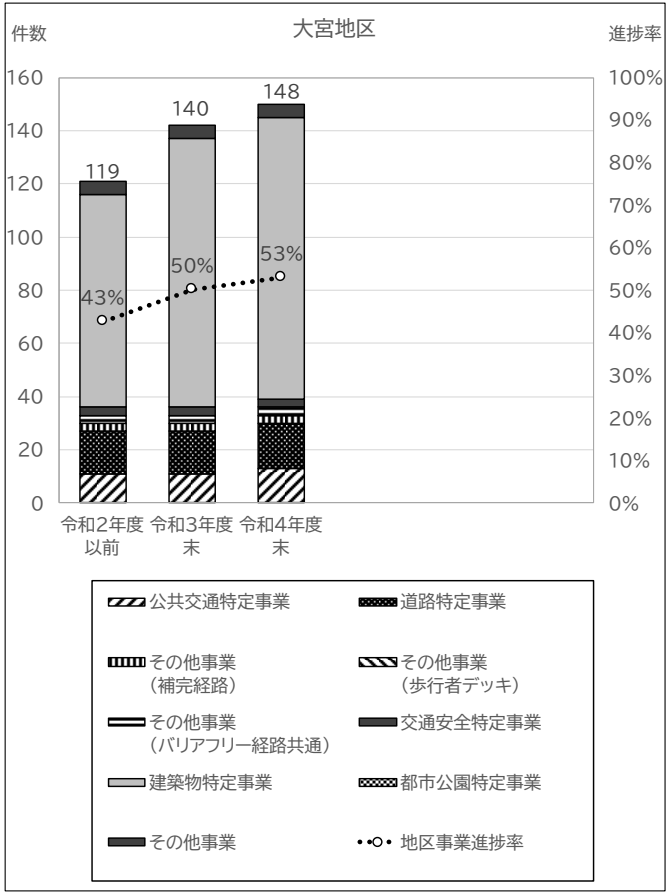

【令和4年度末】重点整備地区ごとの年度ごとの事業進捗状況


完了事業：整備の実施、設備の導入等により完了した事業

継続事業：ノンステップバスの導入や職員の教育など、毎年度事業が進捗しても「完了」とはならず継続して行う事業

北浦和地区 年度別完了・継続事業数

年度別完了・継続事業

上段:単年度事業数 中段:累計事業数 下段:事業進捗率	総事業数	令和2年度 以前	各年度末時点				
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
公共交通特定事業	12	10 10 83%	0 10 83%	1 11 92%			
道路特定事業	17	3 3 18%	0 3 18%	0 3 18%			
その他事業 (補完経路)	10	2 2 20%	0 2 20%	0 2 20%			
その他事業 (歩行者デッキ)	0	0 0	0 0	0 0			
その他事業 (バリアフリー経路共通)	2	2 2 100%	0 2 100%	0 2 100%			
交通安全特定事業	3	3 3 100%	0 3 100%	0 3 100%			
建築物特定事業	126	42 42 33%	28 70 56%	4 74 59%			
都市公園特定事業	3	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%			
その他事業	4	3 3 75%	0 3 75%	0 3 75%			
総計	177	65 65 37%	28 93 53%	5 98 55%			

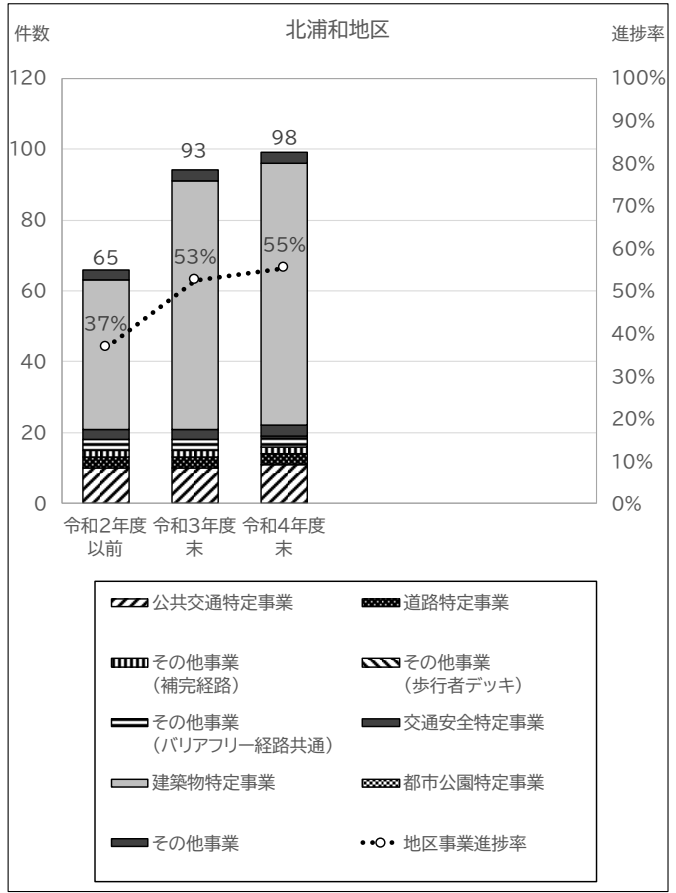

【令和4年度末】重点整備地区ごとの年度ごとの事業進捗状況


完了事業：整備の実施、設備の導入等により完了した事業

継続事業：ノンステップバスの導入や職員の教育など、毎年度事業が進捗しても「完了」とはならず継続して行う事業

浦和地区 年度別完了・継続事業数

年度別完了・継続事業

上段:単年度事業数 中段:累計事業数 下段:事業進捗率	総事業数	令和2年度 以前	各年度末時点				
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
公共交通特定事業	5	4 4 80%	0 4 80%	1 5 100%			
道路特定事業	21	12 12 57%	0 12 57%	0 12 57%			
その他事業 (補完経路)	9	2 2 22%	0 2 22%	0 2 22%			
その他事業 (歩行者デッキ)	0	0 0	0 0	0 0			
その他事業 (バリアフリー経路共通)	2	2 2 100%	0 2 100%	0 2 100%			
交通安全特定事業	3	3 3 100%	0 3 100%	0 3 100%			
建築物特定事業	210	63 63 30%	22 85 40%	14 99 47%			
都市公園特定事業	0	0 0	0 0	0 0			
その他事業	9	7 7 78%	0 7 78%	0 7 78%			
総計	259	93 93 36%	22 115 44%	15 130 50%			

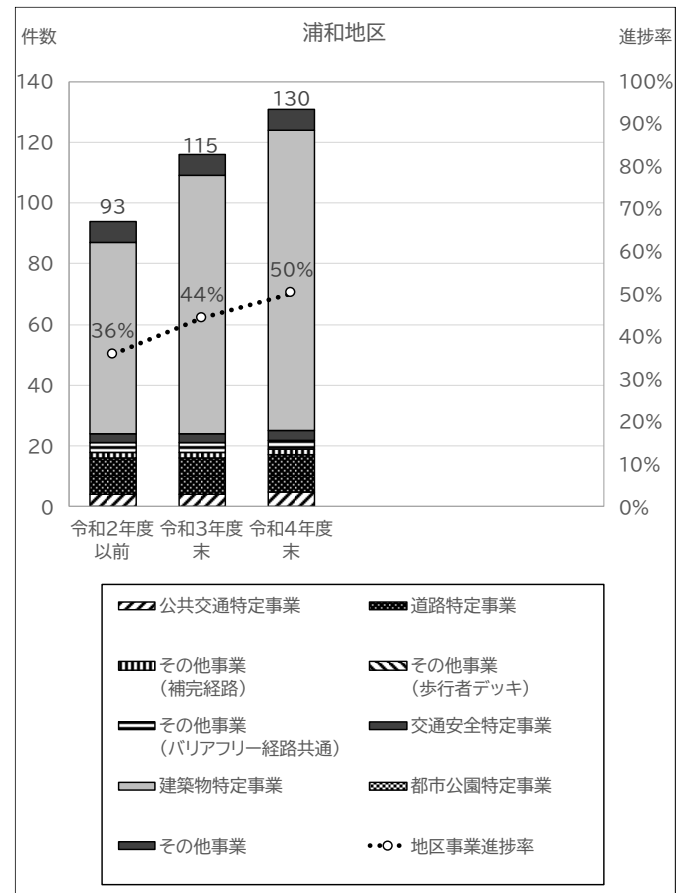


【令和4年度末】重点整備地区ごとの年度ごとの事業進捗状況

完了事業：整備の実施、設備の導入等により完了した事業

継続事業：ノンステップバスの導入や職員の教育など、毎年度事業が進捗しても「完了」とはならず継続して行う事業

さいたま新都心・北与野地区 年度別完了・継続事業数

年度別完了・継続事業 上段：単年度事業数 中段：累計事業数 下段：事業進捗率	総事業数	令和2年度 以前	各年度末時点			
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
公共交通特定事業	21	11 11 52%	1 12 57%	4 16 76%		
道路特定事業	24	10 10 42%	1 11 46%	0 11 46%		
その他事業 (補完経路)	6	2 2 33%	0 2 33%	0 2 33%		
その他事業 (歩行者デッキ)	19	16 16 84%	0 16 84%	1 17 89%		
その他事業 (バリアフリー経路共通)	6	6 6 100%	0 6 100%	0 6 100%		
交通安全特定事業	7	7 7 100%	0 7 100%	0 7 100%		
建築物特定事業	113	54 54 48%	6 60 53%	6 66 58%		
都市公園特定事業	1	1 1 100%	0 1 100%	0 1 100%		
その他事業	0	0 0	0 0	0 0		
総計	197	107 107 54%	8 115 58%	11 126 64%		

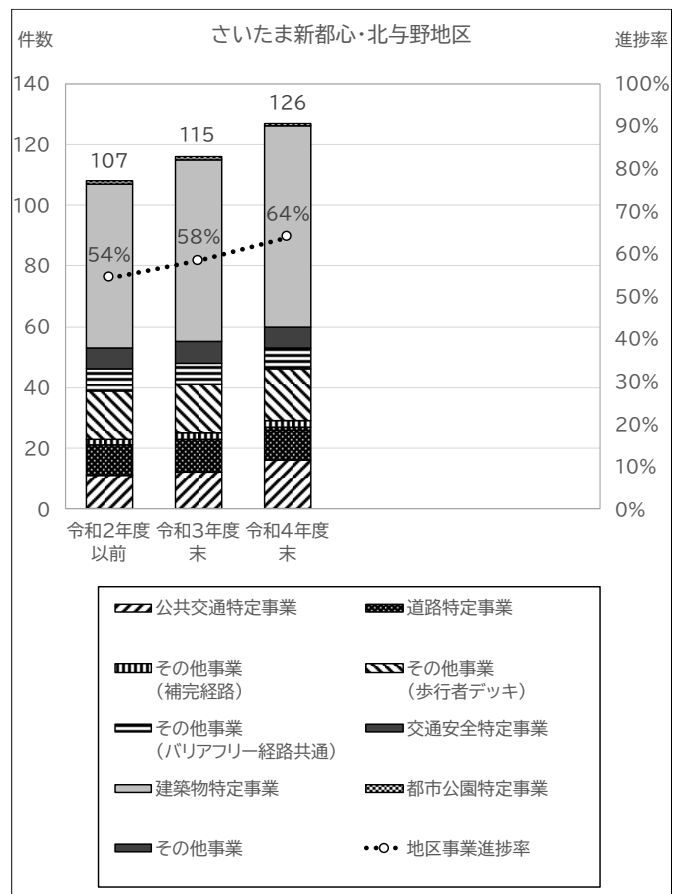

【令和4年度末】重点整備地区ごとの年度ごとの事業進捗状況


完了事業：整備の実施、設備の導入等により完了した事業

継続事業：ノンステップバスの導入や職員の教育など、毎年度事業が進捗しても「完了」とはならず継続して行う事業

武蔵浦和地区 年度別完了・継続事業数

年度別完了・継続事業

上段:単年度事業数 中段:累計事業数 下段:事業進捗率	総事業数	令和2年度 以前	各年度末時点				
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
公共交通特定事業	7	4 4 57%	0 4 57%	1 5 71%			
道路特定事業	17	3 3 18%	0 3 18%	0 3 18%			
その他事業 (補完経路)	3	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%			
その他事業 (歩行者デッキ)	6	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%			
その他事業 (バリアフリー経路共通)	7	7 7 100%	0 7 100%	0 7 100%			
交通安全特定事業	4	4 4 100%	0 4 100%	0 4 100%			
建築物特定事業	162	106 106 65%	6 112 69%	2 114 70%			
都市公園特定事業	0	0 0	0 0	0 0			
その他事業	0	0 0	0 0	0 0			
総計	206	124 124 60%	6 130 63%	3 133 65%			

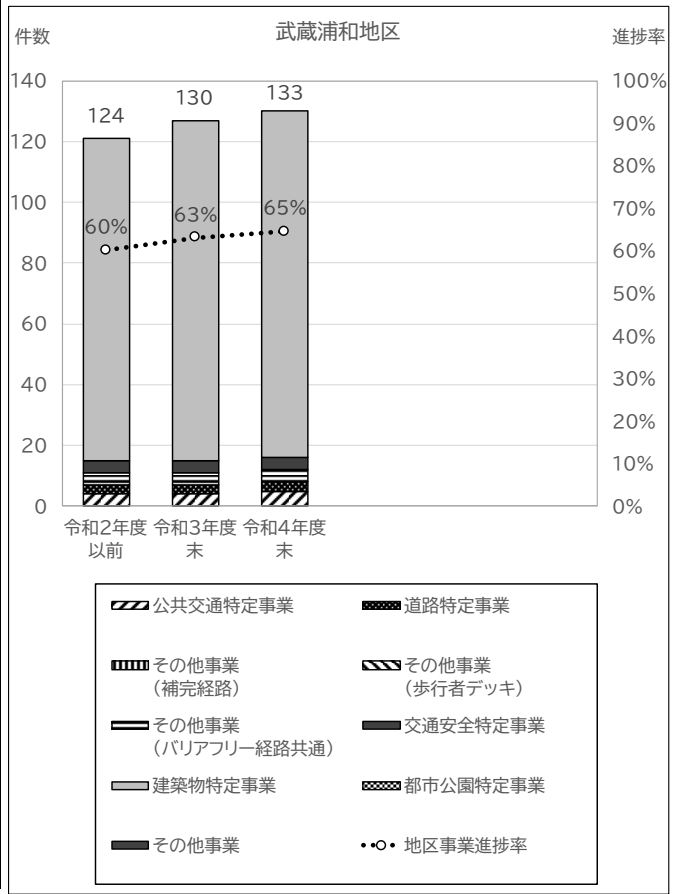


【令和4年度末】重点整備地区ごとの年度ごとの事業進捗状況

完了事業：整備の実施、設備の導入等により完了した事業

継続事業：ノンステップバスの導入や職員の教育など、毎年度事業が進捗しても「完了」とはならず継続して行う事業

岩槻地区 年度別完了・継続事業数


年度別完了・継続事業 上段:単年度事業数 中段:累計事業数 下段:事業進捗率	総事業数	令和2年度 以前	各年度末時点				
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
公共交通特定事業	21	15 15 71%	1 16 76%	1 17 81%			
道路特定事業	13	7 7 54%	0 7 54%	0 7 54%			
その他事業 (補完経路)	5	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%			
その他事業 (歩行者デッキ)	0	0 0	0 0	0 0			
その他事業 (バリアフリー経路共通)	5	5 5 100%	0 5 100%	0 5 100%			
交通安全特定事業	3	3 3 100%	0 3 100%	0 3 100%			
建築物特定事業	123	71 71 58%	4 75 61%	6 81 66%			
都市公園特定事業	0	0 0	0 0	0 0			
その他事業	0	0 0	0 0	0 0			
総計	170	101 101 59%	5 106 62%	7 113 66%			

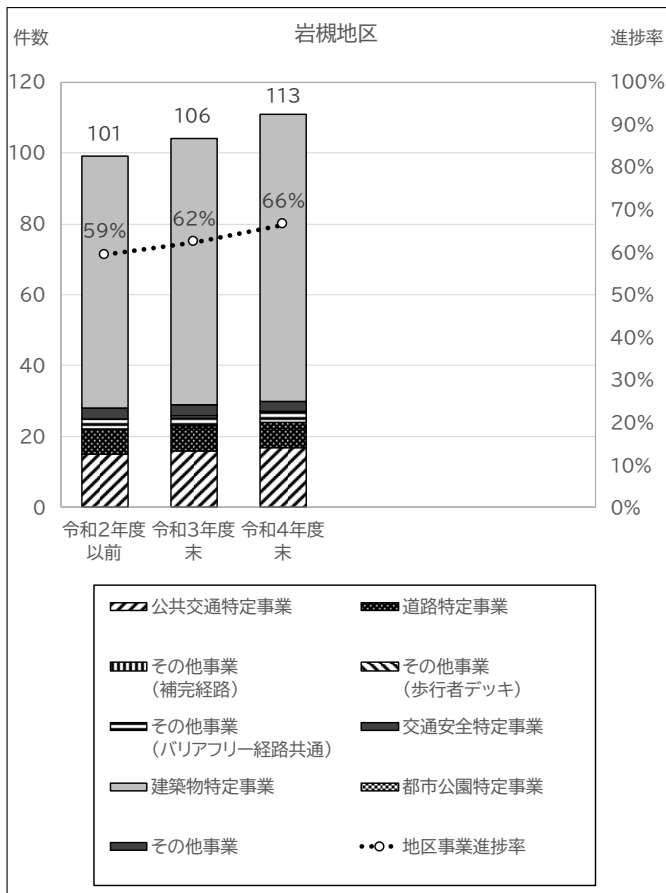

①大宮地区で令和4年度に新たに整備が完了・実施された事業

実施された事業										
No	重点整備地区	事業種別	実施主体	事業箇所	基本構想の記載内容	具体的な事業内容	数量実績		事業実施状況	
					事業内容		当該年度	累計	実績の内容	状況
1	大宮地区	公共交通特定事業	国際興業株式会社	西口駅前広場・東口駅前広場	ノンステップバスを導入する。	ノンステップバスの導入。	14	14	大宮駅乗入路線に8台導入	継続
2	大宮地区	公共交通特定事業	国際興業株式会社	西口駅前広場・東口駅前広場	職員へのバリアフリー対応を指導する(職員研修の実施等)。	・外部のバリアフリー研修を受講し、社内でフィードバックを実施 ・車イスのバスの乗降に関する研修の実施	4	8	研修への派遣4回	継続
3	大宮地区	道路特定事業	さいたま市(大宮駅東口まちづくり事務所)	経路21 氷川緑道西通線	歩道の有効幅員を確保するために、道路標識、電柱、街灯柱の移設を検討する。	歩道の有効幅員を確保するために、電線類を地中化し、電柱の撤去を実施する。	3	25	H29年度:電線共同溝工事完了(電線類地中化工事) R3年度:22本の電柱支柱 R4年度:残り3本の電柱支柱完了	完了
4	大宮地区	交通安全特定事業	埼玉県公安委員会	主要経路・補完経路	主要な交差点にエスコートゾーンを設置する。	要望等に応じ随時検討	-	4	令和3年度、国道17号上落合交差点の4面の横断歩道にエスコートゾーン施工実施	継続
5	大宮地区	建築物特定事業	さいたま市(消費生活総合センター)	消費生活総合センター(大宮情報文化センター(JACK大宮)6階)	コミュニケーション支援ボードの設置	コミュニケーション支援ボードの設置	1式	1式	センターの窓口にコミュニケーション支援ボードを設置した。	完了
6	大宮地区	建築物特定事業	さいたま市(市民生活安全課)	さいたま市大宮ソニック市民ホール(ソニックシティビル)	分かりやすい案内表示の設置	市民ホールまでの経路案内について、ビル管理会社と協議し案内表示を設置する。	8	8	大宮ソニックシティビル共有部の4階エレベーターホール、エスカレーター付近、及び4階通路に案内表示を設置済。	完了
7	大宮地区	建築物特定事業	さいたま市(市民生活安全課)	さいたま市大宮ソニック市民ホール(ソニックシティビル)	掲示物や説明文等は、図の活用や平易な言葉で分かりやすく簡潔に表現		2	2	館内に設置している避難経路案内に図を用い、誰でも分かる表現をしている。	完了
8	大宮地区	建築物特定事業	公益財団法人埼玉県産業文化センター	埼玉県産業文化センター(ソニックシティホール)	車いす利用者対応の自動販売機の設置	ソニックシティホール再開(2023.2)に伴いホールエントランスに設置				完了
9	大宮地区	建築物特定事業	さいたま市(高齢福祉課)	老人福祉センターあずま荘	筆談具と筆談可能な案内の設置				令和4年度に設置完了	完了

道路・交通安全特定事業位置図

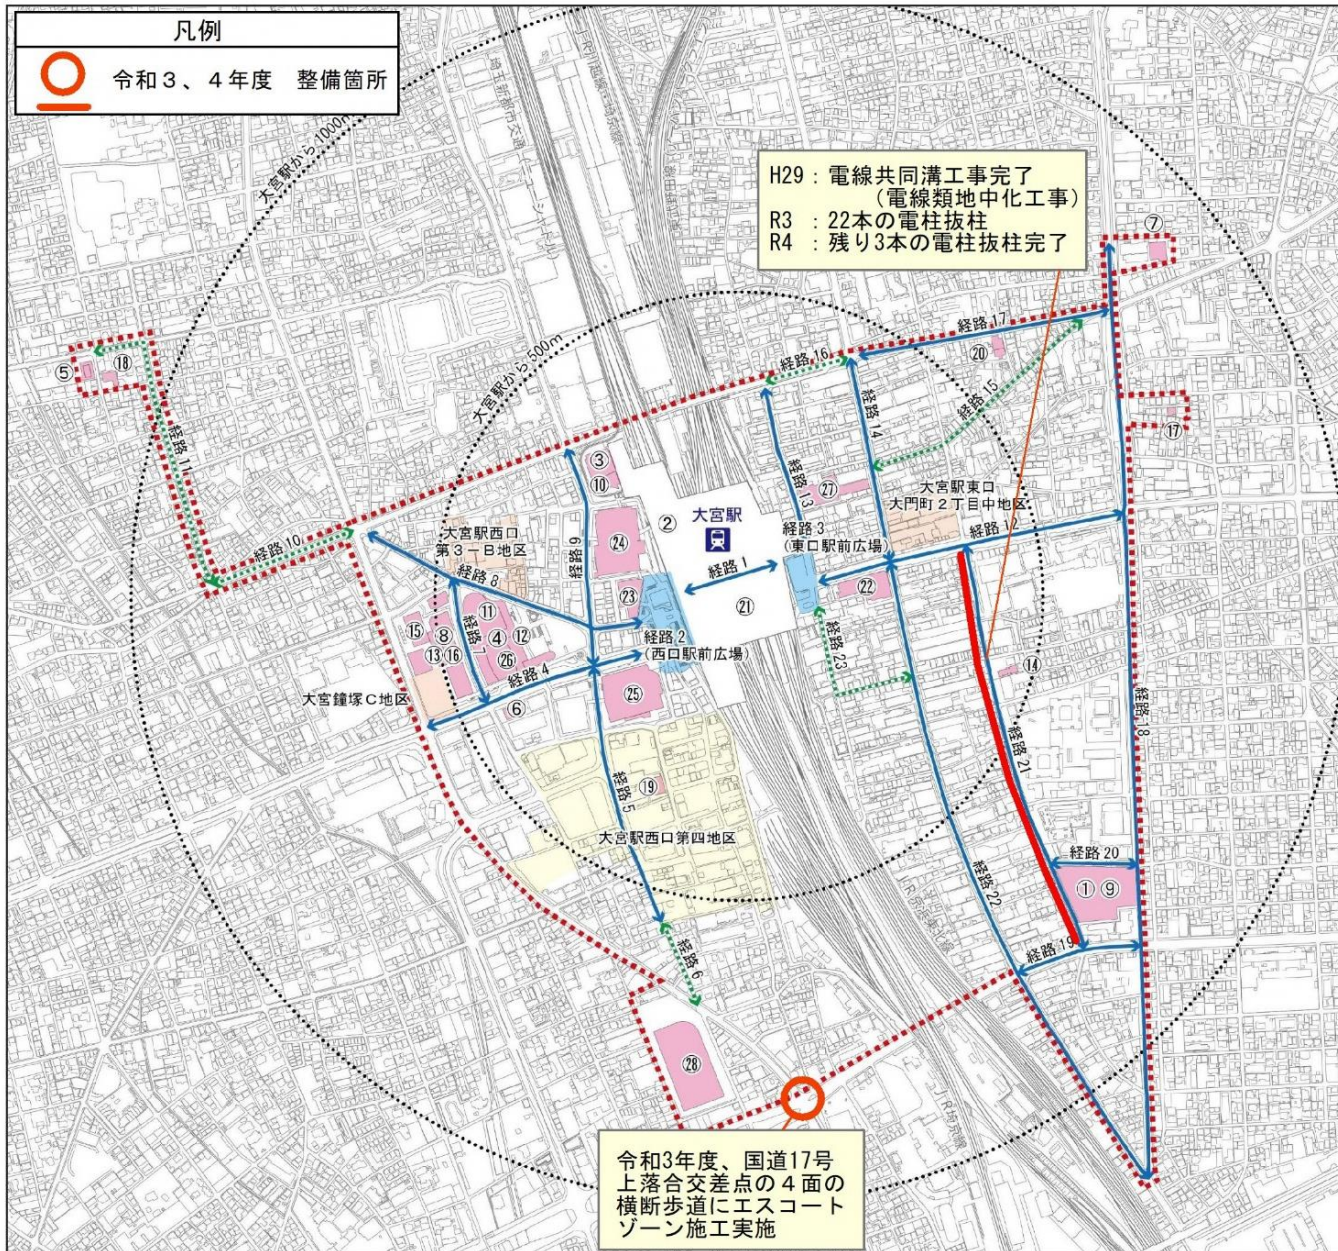

大宮地区

公共・公益施設

- ①大宮区役所（大宮区保健センター他）
- ②大宮駅支所
- ③消費生活総合センター
- ④埼玉県バスポートセンター
- ⑤ハローワーク大宮
- ⑥ハローワークプラザ大宮

文化・文教施設

- ⑦さいたま市立博物館
- ⑧生涯学習総合センター
- ⑨大宮図書館
- ⑩大宮情報文化センター（JACK大宮）
- ⑪さいたま市大宮ソニック市民ホール
- ⑫埼玉県産業文化センター（ソニックシティホール）
- ⑬男女共同参画推進センター
- ⑭大宮中部公民館
- ⑮桜木公民館
- ⑯桜木図書館

福祉施設


- ⑰老人福祉センターあずま荘
- ⑱埼玉点字図書館及び埼玉盲人ホーム
- ⑲子育て支援センターおおみや

医療施設

- ⑳宇治病院

商業施設

- ㉑ルミネ大宮
- ㉒大宮タカシマヤ
- ㉓アルシェビル
- ㉔DOMショッピングセンター
- ㉕そごう大宮店
- ㉖パレスホテル大宮
- ㉗大宮ラクーン
- ㉘ホームズさいたま中央店

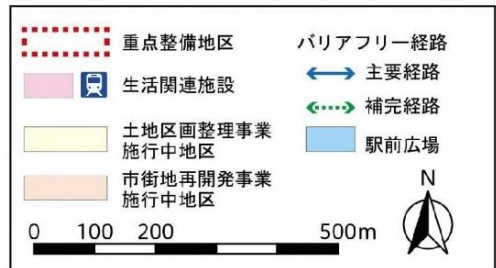

②北浦和地区で令和4年度に新たに整備が完了・実施された事業

実施された事業										
No	重点整備地区	事業種別	実施主体	事業箇所	基本構想の記載内容	具体的な事業内容	数量実績		事業実施状況	
					事業内容		当該年度	累計	実績の内容	状況
1	北浦和地区	公共交通特定事業	国際興業株式会社	北浦和バスターミナル	ノンステップバスを導入する。	ノンステップバスの導入。	8	8	北浦和バスターミナルに8台導入	継続
2	北浦和地区	建築物特定事業	日本年金機構浦和年金事務所	日本年金機構浦和年金事務所	トイレ内へのオストメイト用の設備の設置	多目的トイレにオストメイト用設備を設置	1	1	多目的トイレにオストメイト用設備を設置	完了
3	北浦和地区	建築物特定事業	日本年金機構浦和年金事務所	日本年金機構浦和年金事務所	トイレ内への聴覚障害者等のためのフラッシュライト等の設置	多目的トイレに聴覚障害者のためのフラッシュライトを設置	1	1	多目的トイレに聴覚障害者のためのフラッシュライトを設置	完了
4	北浦和地区	建築物特定事業	さいたま市(福祉総務課)	浦和ふれあい館	筆談具と筆談可能な案内の設置	受付などに筆談具及び案内を設置済			受付などに筆談具(筆談ボード、筆記用具、メモ用紙)及び案内を設置	完了
5	北浦和地区	建築物特定事業	社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団	浦和区障害者生活支援センターむつみ	筆談具と筆談可能な案内の設置				耳マーク、筆談可能な案内設置。筆談は随時対応。	完了

③浦和地区で令和4年度に新たに整備が完了・実施された事業(1/2)

実施された事業										
No	重点整備地区	事業種別	実施主体	事業箇所	基本構想の記載内容	具体的な事業内容	数量実績		事業実施状況	
					事業内容		当該年度	累計	実績の内容	状況
1	浦和地区	公共交通特定事業	国際興業株式会社	西口駅前広場・東口駅前広場	ノンステップバスを導入する。	ノンステップバスの導入。	6	6	浦和駅西口乗入路線に6台導入	継続
2	浦和地区	建築物特定事業	さいたま市(庁舎管理課)	さいたま市役所本庁舎本館及び別館	ビクトグラムの活用や多言語に対応した案内の充実	本庁舎1階(浦和区役所)に設置している多言語サイネージを今後も設置する			引き続き令和4年度も、本庁舎1階(浦和区役所)に多言語サイネージを設置している。	継続
3	浦和地区	建築物特定事業	さいたま市(庁舎管理課)	さいたま市役所本庁舎本館及び別館	筆談具と筆談可能な案内の設置				令和4年度に本庁舎内各課に筆談可能な案内についての表示とコミュニティボードの設置について、周知及び依頼を行った。	完了
4	浦和地区	建築物特定事業	さいたま市(庁舎管理課)	さいたま市役所本庁舎本館及び別館	コミュニケーション支援ボードの設置				令和4年度に本庁舎内各課に筆談可能な案内についての表示とコミュニティボードの設置について、周知及び依頼を行った。	完了
5	浦和地区	建築物特定事業	さいたま市(庁舎管理課)	さいたま市役所本庁舎第二別館	筆談具と筆談可能な案内の設置				令和4年度に本庁舎内各課に筆談可能な案内についての表示とコミュニティボードの設置について、周知及び依頼を行った。	完了
6	浦和地区	建築物特定事業	さいたま市(庁舎管理課)	さいたま市役所本庁舎第二別館	コミュニケーション支援ボードの設置				令和4年度に本庁舎内各課に筆談可能な案内についての表示とコミュニティボードの設置について、周知及び依頼を行った。	完了
7	浦和地区	建築物特定事業	さいたま市(浦和区役所保健センター)	浦和区保健センター	トイレ内での水洗ボタンやペーパーの配置の統一と機能の表示	令和4年度に洋式化修繕に伴い修繕箇所(4箇所)は対応予定	4箇所			完了
8	浦和地区	建築物特定事業	さいたま市(浦和区役所保健センター)	浦和区保健センター	乳幼児用設備の設置	令和4年度に授乳室を1か所設置予定				完了
9	浦和地区	建築物特定事業	さいたま市(浦和区役所保健センター)	浦和区保健センター	筆談具と筆談可能な案内の設置				筆談可能な案内の設置完了、筆記用具と紙を準備完了。	完了
10	浦和地区	建築物特定事業	埼玉県	埼玉県庁	コミュニケーション支援ボードの設置					完了

③浦和地区で令和4年度に新たに整備が完了・実施された事業(2/2)

実施された事業										
No	重点整備地区	事業種別	実施主体	事業箇所	基本構想の記載内容		数量実績		事業実施状況	
					事業内容	具体的な事業内容	当該年度	累計	実績の内容	状況
11	浦和地区	建築物特定事業	さいたま市(浦和消費生活センター)	浦和消費生活センター(ストリームビル9階)	コミュニケーション支援ボードの設置	コミュニケーション支援ボードの設置	1式	1式	センターの窓口にコミュニケーション支援ボードを設置した。	完了
12	浦和地区	建築物特定事業	公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団	埼玉会館	通路の段差の解消					完了
13	浦和地区	建築物特定事業	さいたま市(高齢福祉課)	老人福祉センター仲本荘	筆談具と筆談可能な案内の設置				平成23年5月より筆談具は用意済み。 令和5年1月に筆談具の案内設置済み。	完了
14	浦和地区	建築物特定事業	さいたま市(高齢福祉課)	老人福祉センター仲本荘	コミュニケーション支援ボードの設置	令和5年度に設置予定			令和5年度に設置予定 →令和4年度中に設置済み	完了
15	浦和地区	建築物特定事業	株式会社三越伊勢丹伊勢丹浦和店	伊勢丹浦和店	ピクトグラムの活用や多言語に対応した案内の充実	見やすく分かりやすい案内表示となるよう継続的な見直しを実施する			・各階の案内板のピクトグラムの整理と強化(8種類→15種類) ※添付写真参照	完了

④さいたま新都心・北与野地区で令和4年度に新たに整備が完了・実施された事業

実施された事業										
No	重点整備地区	事業種別	実施主体	事業箇所	基本構想の記載内容	具体的な事業内容	数量実績		事業実施状況	
					事業内容		当該年度	累計	実績の内容	状況
1	さいたま新都心・北与野地区	公共交通特定事業	国際興業株式会社	車両・駅前広場・バス停留所	ノンステップバスを導入する。	ノンステップバスの導入。	6	6	さいたま新都心駅乗入路線に6台導入	継続
2	さいたま新都心・北与野地区	公共交通特定事業	西武バス株式会社	車両・駅前広場・バス停留所	ノンステップバスを導入する。	ノンステップバスを導入し、導入率を上げる。				継続
3	さいたま新都心・北与野地区	公共交通特定事業	西武バス株式会社	車両・駅前広場・バス停留所	バス乗降場を改良する。	バス乗降場の改良				継続
4	さいたま新都心・北与野地区	公共交通特定事業	西武バス株式会社	車両・駅前広場・バス停留所	駅前広場での案内表示を充実する。	駅前広場での案内表示の充実				継続
5	さいたま新都心・北与野地区	その他事業(歩行者デッキ)	埼玉県男女共同参画推進センター	経路5 さいたま新都心地区歩行者デッキ	管理者の連携による適切な維持管理を行う。	屋根の防水改修工事設計に着手する。			屋根防水工事設計及び近接目視点検に係る予算要求を実施した。	継続
6	さいたま新都心・北与野地区	建築物特定事業	株式会社Plan・Do・See	THE MARK GRAND HOTEL	筆談具と筆談可能な案内の設置	筆談専用ボード1点 iPad(筆談アプリ→手書き用ペンシル使用)1点をフロントに常備	2	2	筆談専用ボード1点 iPad(筆談アプリ→手書き用ペンシル使用)1点をフロントに常備	完了
7	さいたま新都心・北与野地区	建築物特定事業	株式会社Plan・Do・See	THE MARK GRAND HOTEL	コミュニケーション支援ボードの設置	iPad内へ支援ボードのURLをデスクトップへ用意。必要に応じて使用	1	1	iPad内へ支援ボードのURLをデスクトップへ用意。必要に応じて使用	完了
8	さいたま新都心・北与野地区	建築物特定事業	片倉工業株式会社コクーンシティ	コクーン1・2・3	筆談具と筆談可能な案内の設置	iPadの活用を検討する。			ipadに対象アプリケーションをインストールした。	完了
9	さいたま新都心・北与野地区	建築物特定事業	片倉工業株式会社コクーンシティ	コクーン1・2・3	コミュニケーション支援ボードの設置	iPadの活用を検討する。			ipadに対象アプリケーションをインストールした。	完了
10	さいたま新都心・北与野地区	建築物特定事業	さいたま市(自転車まちづくり推進課)	市営北与野駅北口地下駐車場	車いす利用者用駐車施設の増設検討		2	2		完了
11	さいたま新都心・北与野地区	建築物特定事業	さいたま市(自転車まちづくり推進課)	市営北与野駅北口地下駐車場	車いす使用者の利用に配慮したカウンターや記入台の設置		1	1		完了

⑤ 武蔵浦和地区で令和4年度に新たに整備が完了・実施された事業

実施された事業										
No	重点整備地区	事業種別	実施主体	事業箇所	基本構想の記載内容		数量実績		事業実施状況	
					事業内容	具体的な事業内容	当該年度	累計	実績の内容	状況
1	武蔵浦和地区	公共交通特定事業	国際興業株式会社	車両・駅前広場・バス停留所	ノンステップバスを導入する。	ノンステップバスの導入。	6	6	武蔵浦和駅乗入路線に6台導入	継続
2	武蔵浦和地区	建築物特定事業	さいたま市(障害福祉課)	南区障害者生活支援センター社協ひまわり	分かりやすい案内表示の設置	バリアフリー経路等がわかる案内を作成し、設置した。	1	1	バリアフリー経路等がわかる案内を作成し、設置した。	完了
3	武蔵浦和地区	建築物特定事業	株式会社マルエツ	マルエツ武蔵浦和店	わかりやすい掲示物など聴覚障害者への情報提供の配慮				サービスカウンターにて筆談対応	継続

⑥ 岩槻地区で令和4年度に新たに整備が完了・実施された事業

実施された事業										
No	重点整備地区	事業種別	実施主体	事業箇所	基本構想の記載内容	具体的な事業内容	数量実績		事業実施状況	
					事業内容		当該年度	累計	実績の内容	状況
1	岩槻地区	公共交通特定事業	国際興業株式会社	車両・駅前広場・バス停留所	ノンステップバスを導入する。	ノンステップバスの導入。	8	8	岩槻駅乗入路線に8台導入	継続
2	岩槻地区	建築物特定事業	さいたま市(岩槻消費生活センター)	岩槻消費生活センター(ワッツ東館3階)	コミュニケーション支援ボードの設置	コミュニケーション支援ボードの設置	1式	1式	センターの窓口にコミュニケーション支援ボードを設置した。	完了
3	岩槻地区	建築物特定事業	さいたま市社会福祉協議会	シニアサポートセンター社協岩槻(ワッツ東館3階)	筆談具と筆談可能な案内の設置					完了
4	岩槻地区	建築物特定事業	さいたま市(岩槻駅東口図書館)	岩槻駅東口図書館(ワッツ西館3階)	ピクトグラムの活用や多言語に対応した案内の充実	ピクトグラムや多言語を用いた案内表示を充実させる。				継続
5	岩槻地区	建築物特定事業	さいたま市(岩槻駅東口図書館)	岩槻駅東口図書館(ワッツ西館3階)	音声以外の電光表示等による動的な案内設備の設置				職員が人的に対応	継続
6	岩槻地区	建築物特定事業	さいたま市(岩槻図書館)	岩槻図書館	ピクトグラムの活用や多言語に対応した案内の充実	ピクトグラムや多言語を用いた案内表示を充実させる。				継続
7	岩槻地区	建築物特定事業	さいたま市(岩槻図書館)	岩槻図書館	音声以外の電光表示等による動的な案内設備の設置				職員が人的に対応	継続

⑦さいたま市全域で令和4年度に新たに整備が完了・実施された事業

実施された事業										
No	重点整備地区	事業種別	実施主体	事業箇所	基本構想の記載内容		数量実績		事業実施状況	
					事業内容	具体的な事業内容	当該年度	累計	実績の内容	状況
1	さいたま市全域	教育啓発特定事業	さいたま市(都市経営戦略部)	「思いやりの心」を育む研修(体験型)	バリアフリーに関する疑似体験	バリアフリー疑似体験を通じて、業務を行う上での気づきの心や窓口対応での気づきの心といった「思いやりの心」を育む	1	2	計画通りにバリアフリー疑似体験の研修を実施。さらに、ユニバーサルデザインやその実装例について学んだ。	継続
2	さいたま市全域	教育啓発特定事業	さいたま市(福祉総務課)	心のバリアフリー促進啓発事業	広報活動による教育啓発活動		513箇所	999箇所	心のバリアフリーに関するポスターやポケットティッシュの設置を庁内施設と民間の協力事業者の施設にて実施しました。	継続
3	さいたま市全域	教育啓発特定事業	さいたま市(福祉総務課)	さいたま市福祉のまちづくりモデル地区推進事業	小中学校において福祉のまちづくりを地域ぐるみで学び合う教育啓発活動				日進北小学校にて5年生の児童を対象に、福祉関係団体の協力を得て、ふれあい学習、まち歩き学習(学校周辺とさいたま新都心駅周辺)、学習発表会を実施。	継続
4	さいたま市全域	教育啓発特定事業	さいたま市(障害政策課)	ノーマライゼーションの更なる普及・啓発	イベント等を通じた市民への教育啓発活動	ブラインドサッカーの親善試合であるノーマライゼーションカップの開催、「障害者週間」市民のつどいの実施	2回	3回	令和4年12月3日(土)に「障害者週間」市民のつどいを会場で開催し、1,616人の方に来場いただきました。ノーマライゼーションカップについては、令和5年2月25日(土)を会場で開催し、421名の方に来場いただきました。	継続
5	さいたま市全域	教育啓発特定事業	さいたま市(都心整備課)	バリアフリー体験・見学	バリアフリー体験を通じた教育啓発活動	バリアフリーまちづくりボランティアにより車いすや白杖の経験を実施する	4回	9回	バリアフリーまちづくりボランティアにより車いすや白杖の経験を実施した	継続
6	さいたま市全域	教育啓発特定事業	さいたま市(生涯学習総合センター)	障害者の生涯学習の推進	教育啓発活動による学習機会の提供	障害をテーマとした事業や、障害者に配慮した事業等を実施する。	80	175	55館の公民館において、障害をテーマとした事業や、手話通訳者を配置するなど障害者に配慮した事業を計80事業実施した。	継続
7	さいたま市全域	教育啓発特定事業	さいたま市(教育委員会)	心のバリアフリーに関する学校教育の推進	学校教育における心のバリアフリーに関する教育活動の推進	福祉教育の充実に向け、各小中学校の実態に応じて各種体験活動を実施する	88	166	市内各小中学校が各校の実態に応じて各種体験活動を実施することにより、福祉教育の充実を図った	継続
