

さいたま市総合振興計画実施計画(平成 17~20 年度)

の実績及び達成状況について

平成21年8月

政策局 政策企画部 企画調整課

目次


| | |
|---|-----|
| 総合振興計画実施計画（平成 17～20 年度）の実績及び達成状況について | ページ |
| 1 はじめに | 1 |
| 2 達成状況の概要 | 2 |
| (1) 4年間の分野別達成状況 | 2 |
| (2) 分野別事業一覧 | 4 |
| (3) 「未達成」と判定した事業（29事業）とその理由 | 11 |
| (4) 希望（ゆめ）のまちづくり事業の達成状況 | 14 |
| 3 「都市経営の基本戦略取組状況」について | 22 |
| 4 「総合振興計画実施計画事業（平成 17～20 年度）の実績及び達成状況一覧表」について | 23 |
| | |
| 総合振興計画実施計画事業（平成 17～20 年度）の実績及び達成状況一覧表 | ページ |
| 第 1 章 環境・アメニティの分野 | 1 |
| 第 2 章 健康・福祉の分野 | 11 |
| 第 3 章 教育・文化・スポーツの分野 | 24 |
| 第 4 章 都市基盤・交通の分野 | 37 |
| 第 5 章 産業・経済の分野 | 57 |
| 第 6 章 安全・生活基盤の分野 | 67 |
| 第 7 章 交流・コミュニティの分野 | 77 |

総合振興計画実施計画（平成 17～20 年度）の実績及び達成状況について

1 はじめに

本市は、3市合併により、埼玉県で初めての100万人都市として誕生し、平成15年4月には政令指定都市に移行しました。これに伴い、政令指定都市にふさわしい都市づくりの指針として基本構想、基本計画、実施計画の3層からなる「さいたま市総合振興計画（さいたま希望のまちプラン）」を策定し、岩槻市との合併に伴い、平成17年度に改定を行いました。

これまで本市では、基本構想に掲げた将来都市像の実現に向けて、実施計画に定めた事業の推進に取り組んできましたが、平成20年度をもって、実施計画の計画期間が満了したため、4年間（平成17年度から平成20年度）の実績及び達成状況の取りまとめを行いました。

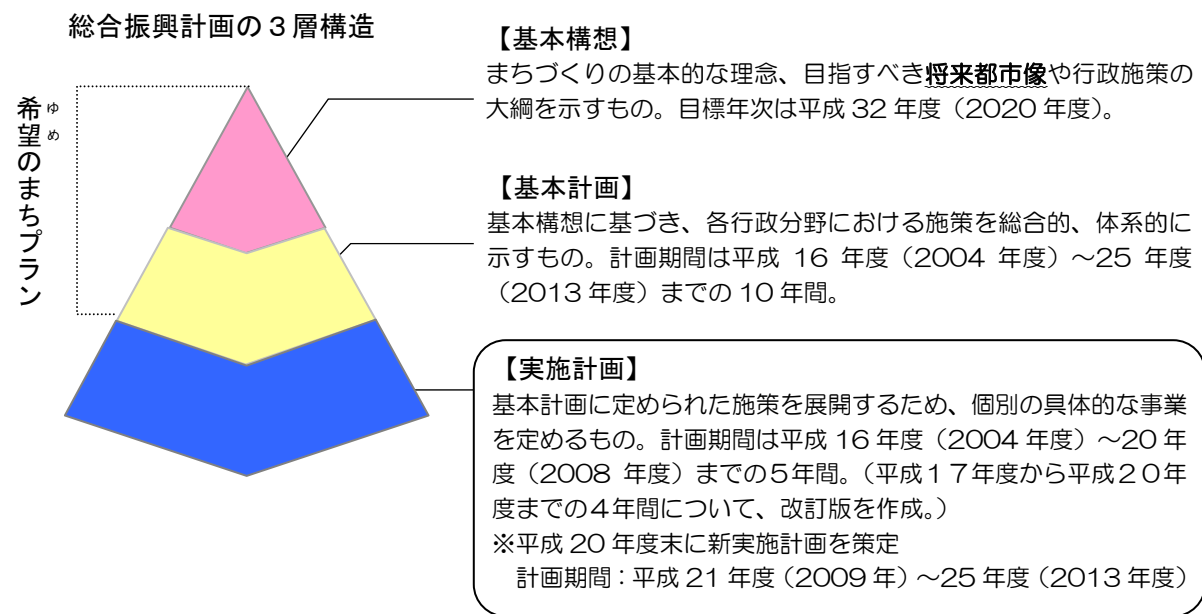

〈将来都市像〉

- 多彩な都市活動が展開される東日本の交流拠点都市
- 見沼の緑と荒川の水に象徴される環境共生都市
- 若い力の育つゆとりある生活文化都市

2 達成状況の概要

(1) 4年間の分野別達成状況

「第4編 実施計画事業」に掲げた全255事業のうち、
 「達成」と判定した事業は132事業（全体の51.8%）
 「一定の成果あり」とした事業は94事業（全体の36.9%）、
 「未達成」とした事業は29事業（全体の11.4%）
 でした。


〈達成状況の判定基準〉

| | | |
|---|---------------|-----------------------|
| ① | 達成 ★★★ | 平成20年度末の計画目標を概ね達成したもの |
| ② | 一定の成果あり ★★ | ①に達しないが、概ね7割以上を達したもの |
| ③ | 未達成 ★ | ②に達していないもの |

| 分野（事業数） | 平成17年度進捗状況 | | | 平成18年度進捗状況 | | | 平成19年度進捗状況 | | | 平成20年度を含めた4年間の達成状況 | | |
|----------------------|------------|----------|---------|------------|----------|---------|------------|----------|---------|--------------------|-------------------|----------|
| | 達成 ★★★ | 順調 ★★ | 遅れ ★ | 達成 ★★★ | 順調 ★★ | 遅れ ★ | 達成 ★★★ | 順調 ★★ | 遅れ ★ | 達成 ★★★ | 一定の 成果あり ★★ | 未達成 ★ |
| 第1章 環境・アメニティ（22事業） | 1 | 15 | 6 | 1 | 18 | 3 | 3 | 14 | 5 | 9 | 8 | 5 |
| 第2章 健康・福祉（40事業） | 0 | 40 | 0 | 5 | 31 | 4 | 7 | 30 | 3 | 23 | 14 | 3 |
| 第3章 教育・文化・スポーツ（42事業） | 0 | 40 | 2 | 3 | 37 | 2 | 10 | 30 | 2 | 24 | 15 | 3 |
| 第4章 都市基盤・交通（68事業） | 0 | 59 | 9 | 6 | 53 | 9 | 8 | 50 | 10 | 29 | 29 | 10 |
| 第5章 産業・経済（28事業） | 0 | 25 | 3 | 0 | 21 | 7 | 2 | 21 | 5 | 15 | 8 | 5 |
| 第6章 安全・生活基盤（33事業） | 0 | 30 | 3 | 3 | 28 | 2 | 6 | 24 | 3 | 19 | 11 | 3 |
| 第7章 交流・コミュニティ（22事業） | 1 | 20 | 1 | 1 | 21 | 0 | 4 | 18 | 0 | 13 | 9 | 0 |
| 計（255事業） | 2 | 229 | 24 | 19 | 209 | 27 | 40 | 187 | 28 | 132 | 94 | 29 |
| 割合 | 0.8% | 89.8% | 9.4% | 7.4% | 82.0% | 10.6% | 15.7% | 73.3% | 11.0% | 51.8% | 36.9% | 11.4% |

※ 端数処理の関係により、合計が 100%にならない場合があります。以下同様。

4年間の分野別達成状況の割合

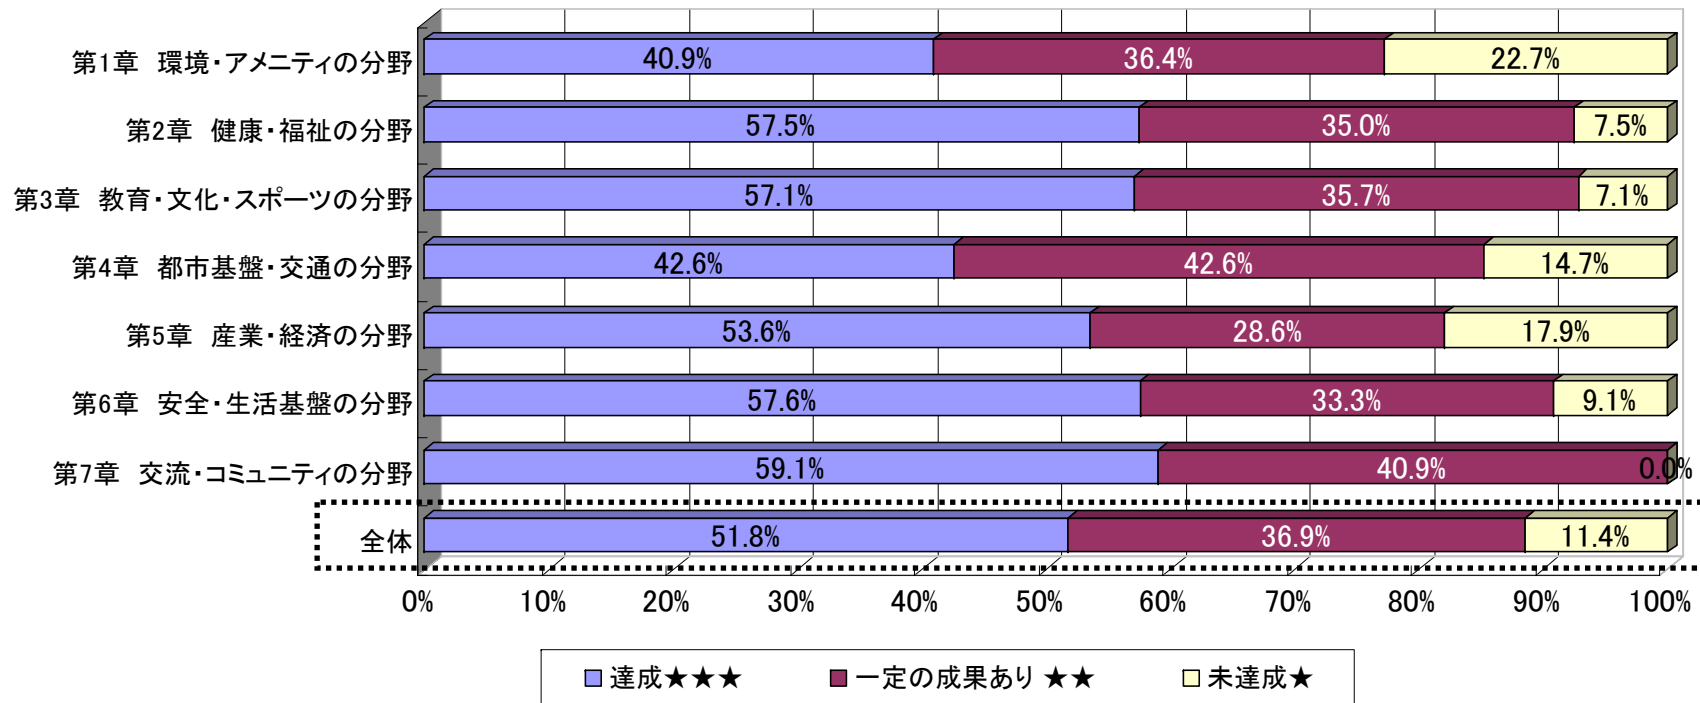

(2) 分野別事業一覧

第1章 環境・アメニティの分野(22事業)

| 「達成」(★★★)とした事業【9事業】 | | | 「一定の成果あり」(★★)とした事業【8事業】 | | | 「未達成」(★)とした事業【5事業】 | | |
|---------------------|-------------------|----|-------------------------|------------------|---|--------------------|----------------------|---|
| 番号 | 事業の名称 | 頁 | 番号 | 事業の名称 | 頁 | 番号 | 事業の名称 | 頁 |
| 1102 | 環境保全政策推進事業 | 1 | 1101 | 環境優先のまちづくりの推進 | 1 | 1109 | 環境教育・学習の推進(再掲3章1節) | 5 |
| 1105 | 廃棄物減量等推進員事業 | 3 | 1103 | 地球温暖化防止推進事業 | 2 | 1201 | 自然緑地の保全・整備事業 | 6 |
| 1108 | ダイオキシン類対策の推進 | 4 | 1104 | ごみ減量・リサイクル推進事業 | 3 | 1203 | 高沼用水路整備事業(再掲6章1節) | 6 |
| 1207 | (仮)セントラルパーク整備事業 | 7 | 1106 | 廃棄物処理施設の整備 | 4 | 1204 | 加田屋地区自然環境公園整備事業 | 6 |
| 1208 | 七里総合公園整備事業 | 7 | 1107 | 低公害車普及促進対策事業 | 4 | 1209 | 緑の核づくり公園整備事業(再掲4章3節) | 8 |
| 1301 | 都市景観形成推進事業 | 9 | 1202 | クマガイソウの里緑地の保全・整備 | 6 | | | |
| 1302 | 道路美装化推進事業(再掲4章2節) | 9 | 1205 | 高沼遊歩道整備事業 | 6 | | | |
| 1303 | 屋外広告物適正化推進事業 | 10 | 1206 | 見沼グリーンプロジェクトの推進 | 7 | | | |
| 1304 | 環境美化推進事業 | 10 | | | | | | |

※ 頁は「総合振興計画実施計画事業(平成17～20年度)の実績及び達成状況一覧表」を示します。以下同様。

第2章 健康・福祉の分野（40事業）

| 「達成」(★★★)とした事業【23事業】 | | | 「一定の成果あり」(★★)とした事業【14事業】 | | | 「未達成」(★)とした事業【3事業】 | | |
|----------------------|--------------------------------------|-------|--------------------------|-------------------------------|----|--------------------|---------------------------|----|
| 番号 | 事業の名称 | 頁 | 番号 | 事業の名称 | 頁 | 番号 | 事業の名称 | 頁 |
| 2102 | 福祉のまちづくりの推進(再掲4章1節) | 11 | 2101 | 地域健康福祉連絡会の設置・運営 | 11 | 2205 | 児童センター整備事業 | 13 |
| 2203 | 地域子育て支援センター整備事業 | 12 | 2103 | 交通バリアフリーの推進(再掲4章1節、2節) | 11 | 2307 | 高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業(再掲6章3節) | 17 |
| 2206 | 子育て支援総合事業 | 13 | 2201 | 乳幼児健康診査の充実 | 12 | 2504 | 市立病院機能の再整備事業 | 21 |
| 2211 | 小児救急医療体制の充実・強化(再掲2章5節) | 15・22 | 2202 | 子育て支援ネットワーク事業 | 12 | | | |
| 2301 | シルバー人材センターの充実・シルバーバンク事業(再掲5章3節、7章3節) | 16 | 2204 | ファミリーサポートセンターの充実(再掲5章3節、7章2節) | 13 | | | |
| 2302 | (仮)高齢者生きがい活動センター整備事業 | 16 | 2207 | 保育所の新設整備事業 | 14 | | | |
| 2303 | 居宅介護サービスの充実 | 16 | 2208 | 放課後児童健全育成事業 | 14 | | | |
| 2304 | 介護保険関連施設等の整備促進 | 17 | 2209 | ナーサリールーム(認定保育室)事業 | 14 | | | |
| 2305 | (仮)西部地区高齢者総合福祉施設整備事業 | 17 | 2210 | 児童虐待防止対策事業 | 15 | | | |
| 2401 | 障害児療育システム構築事業 | 18 | 2306 | 高齢者地域ケア・ネットワークの構築 | 17 | | | |
| 2403 | グループホーム・生活ホームの設置促進 | 18 | 2402 | 在宅福祉サービスの充実 | 18 | | | |
| 2404 | 障害者生活支援センター設置事業 | 18 | 2405 | 特別支援教育事業の推進(再掲3章1節) | 19 | | | |
| 2407 | 障害者就労支援事業(再掲5章3節) | 19 | 2406 | 知的障害者援護施設整備促進事業 | 19 | | | |
| 2409 | 公立障害者施設整備事業 | 20 | 2408 | 障害者のスポーツ参加の推進(再掲3章3節) | 20 | | | |
| 2501 | 健康づくり推進事業 | 21 | | | | | | |
| 2502 | 保健所等複合施設整備事業 | 21 | | | | | | |
| 2503 | (仮)さいたま市民医療センター整備事業 | 21 | | | | | | |
| 2505 | 各区の緊急医療体制の整備 | 22 | | | | | | |
| 2506 | 保健医療・防疫システムの整備 | 22 | | | | | | |
| 2601 | 食の安全確保対策事業 | 23 | | | | | | |
| 2602 | 市場流通食品HACCP導入促進事業 | 23 | | | | | | |
| 2603 | 動物愛護推進事業 | 23 | | | | | | |

■ 同一章内に再掲される事業(再掲分の記載は省略)

第3章 教育・文化・スポーツの分野（42事業）

| 「達成」(★★★)とした事業【24事業】 | | | 「一定の成果あり」(★★)とした事業【15事業】 | | | 「未達成」(★)とした事業【3事業】 | | |
|----------------------|-----------------------------|----|--------------------------|------------------------|----|--------------------|-----------------------|----|
| 番号 | 事業の名称 | 頁 | 番号 | 事業の名称 | 頁 | 番号 | 事業の名称 | 頁 |
| 3101 | 少人数指導の充実 | 24 | 3105 | 国際理解教育・交流事業(再掲7章1節) | 26 | 1109 | 環境教育・学習の推進(再掲1章1節) | 24 |
| 3102 | 特色のある学校づくり推進事業 | 24 | 3106 | 情報教育の充実(再掲4章4節) | 26 | 3401 | 盆栽文化の振興・活用(再掲5章2節) | 35 |
| 3103 | 小・中一貫「潤いの時間」の展開 | 25 | 2405 | 特別支援教育事業の推進(再掲2章4節) | 26 | 3407 | (仮)岩槻人形会館整備事業(再掲5章2節) | 36 |
| 3104 | 生徒指導総合計画子ども潤いプランの推進 | 25 | 3107 | 教育相談・相談室運営事業 | 27 | | | |
| 3109-2 | 小中学校整備事業[耐震補強事業] | 28 | 3108 | 過大規模校解消事業 | 27 | | | |
| 3109-3 | 小中学校整備事業[空調設備設置事業] | 28 | 3109-1 | 小中学校整備事業[施設改修等の推進] | 27 | | | |
| 3110 | 学校図書館の充実 | 28 | 3114 | さいたま教育コラボレーション構想の推進 | 29 | | | |
| 3111 | 学校給食施設の整備 | 28 | 3115 | 地域講師派遣事業 | 29 | | | |
| 3112 | 市立高等学校の整備 | 29 | 3202 | 市民大学の充実 | 31 | | | |
| 3113 | 中高一貫教育の推進 | 29 | 3301 | 秋葉の森総合公園整備事業(再掲4章3節) | 32 | | | |
| 3116 | 地域に開かれた学校運営の推進 | 30 | 2408 | 障害者のスポーツ参加の推進(再掲2章4節) | 32 | | | |
| 3117 | 学びの向上さいたまプランの策定・推進 | 30 | 3307 | さいたまシティカップ開催事業(再掲7章1節) | 33 | | | |
| 3201 | 図書館整備事業 | 31 | 3402 | 氷川参道の整備(再掲4章1節) | 35 | | | |
| 3203 | (仮)鈴谷地区公民館建設事業 | 31 | 3403 | 見沼通船堀公園整備事業 | 35 | | | |
| 3204 | 青少年の健全育成事業(再掲6章2節) | 31 | 3408 | 歴史的資源の保存・整備事業 | 36 | | | |
| 3302 | 校庭開放夜間照明整備事業 | 32 | | | | | | |
| 3303 | 国際スポーツイベントの開催支援・招致(再掲7章1節) | 32 | | | | | | |
| 3304 | シティマラソンの開催 | 33 | | | | | | |
| 3305 | さいたま・たていわ親善ツアーデーの開催(再掲7章1節) | 33 | | | | | | |
| 3306 | 総合型地域スポーツクラブ支援事業 | 33 | | | | | | |
| 3308 | サッカーのまちづくり推進事業 | 34 | | | | | | |
| 3404 | 鉄道博物館の整備促進(再掲5章2節) | 35 | | | | | | |
| 3405 | スポーツ文学賞事業 | 36 | | | | | | |
| 3406 | 漫画・ユーモア文化の振興事業 | 36 | | | | | | |


第4章 都市基盤・交通の分野（68事業）

| 「達成」(★★★)とした事業【29事業】 | | | 「一定の成果あり」(★★)とした事業【29事業】 | | | 「未達成」(★)とした事業【10事業】 | | |
|----------------------|--|----|--------------------------|---|-------|---------------------|----------------------|----|
| 番号 | 事業の名称 | 頁 | 番号 | 事業の名称 | 頁 | 番号 | 事業の名称 | 頁 |
| 4101-1 | 災害に強いまちづくりの推進(再掲6章1節) [災害に強いまちづくり計画の策定] | 37 | 4101-2 | 災害に強いまちづくりの推進(再掲6章1節) [市有建築物安全安心診断事業の推進] | 37 | 4107 | 大宮駅東口駅前地区整備推進事業 | 39 |
| 4102 | まちづくり団体支援・育成事業 | 37 | 2103 | 交通バリアフリーの推進(再掲2章1節、4章2節) | 39・52 | 4110 | 大宮駅西口整備推進事業 | 40 |
| 4103 | まちづくりへの市民参加の推進 | 38 | 3402 | 氷川参道の整備(再掲3章4節) | 39 | 4115 | 浦和駅周辺鉄道高架化事業 | 42 |
| 4104 | 地区計画等推進事業 | 38 | 4106 | 大宮駅東口都市再生プラン推進事業 | 39 | 4119 | 武蔵浦和駅第7-1街区整備事業 | 43 |
| 2102 | 福祉のまちづくりの推進(再掲2章1節) | 38 | 4109 | 複合交通拠点整備推進事業 | 40 | 4124 | 江川土地区画整理事業 | 44 |
| 4108 | まちづくり支援事業(大宮駅周辺地区) | 40 | 4112 | さいたま新都心にぎわい創出事業 | 41 | 4125 | 南平野土地区画整理事業 | 44 |
| 4111 | 大宮駅西口第四土地区画整理事業 | 40 | 4117 | 日進駅周辺まちづくり推進事業 | 42 | 4127 | 指扇駅周辺の整備促進 | 45 |
| 4113 | 浦和駅東口駅前地区第二種市街地再開発事業 | 41 | 4120 | 浦和東部第一特定土地区画整理事業 | 43 | 4221 | 駅前広場改修事業 | 53 |
| 4114 | 浦和駅西口南地区市街地再開発事業 | 41 | 4121 | 浦和東部第二特定土地区画整理事業 | 43 | 1209 | 緑の核づくり公園整備事業(再掲1章2節) | 54 |
| 4116 | 北部拠点宮原土地区画整理事業及び周辺地区交通対策事業の推進 | 42 | 4122 | 岩槻南部新和西特定土地区画整理事業 | 44 | 4405 | 電子投票システムの導入 | 56 |
| 4118 | 武蔵浦和駅周辺地区市街地再開発事業 | 43 | 4123 | 岩槻駅西口土地区画整理事業 | 44 | | | |
| 4126 | 東岩槻駅舎改修の促進 | 45 | 4129 | 土地区画整理事業 | 46 | | | |
| 4128 | 市街地整備基本計画の策定 | 45 | 4130 | 土地区画整理事業の推進 | 46 | | | |
| 4131 | 中心市街地活性化事業の推進(再掲5章2節) | 47 | 4201 | 総合都市交通体系の確立 | 48 | | | |
| 4202 | 道路整備計画策定事業 | 48 | 4204 | 広域幹線道路の整備 | 48 | | | |
| 4203 | 都市計画道路整備プログラム策定事業 | 48 | 4205 | 市内幹線道路の整備 | 49 | | | |
| 4207 | 高速埼玉新都心線の整備促進 | 49 | 4206 | 高速埼玉中央道路の整備促進 | 49 | | | |
| 4208 | 橋りょう耐震補強及び落橋防止対策事業(再掲6章1節) | 49 | 4210 | 歩道整備事業(再掲6章2節) | 49 | | | |
| 4209 | 踏切構造改良事業 | 49 | 4211 | 交通渋滞解消事業(さいたまの道スムーズプラン)(再掲6章2節) | 50 | | | |
| 1302 | 道路美化推進事業(再掲1章3節) | 50 | 4212 | 道路施設維持管理計画策定事業 | 50 | | | |
| 4213 | スマイルロード整備事業 | 51 | 4214 | 暮らしの道路整備事業 | 51 | | | |
| 4215 | 新駅の設置促進(日進～指扇駅間) | 51 | 4216 | 埼玉高速鉄道線(地下鉄7号線)の延伸促進 | 51 | | | |
| 4217 | 埼玉高速鉄道線の支援 | 51 | 4218 | 公共交通(東西交通大宮ルート等)ネットワーク基本計画の策定 | 52 | | | |
| 4220 | 駐車場・自転車駐車場の整備事業 | 52 | 4219 | 市内路線バス・コミュニティバス整備事業 | 52 | | | |
| 4301 | 緑化推進事業 | 54 | 4302 | 公園リフレッシュ事業 | 54 | | | |
| 4401 | 市民のIT活動の支援 | 55 | 4303 | 与野中央公園整備事業 | 54 | | | |
| 4402 | 電子市役所の構築 | 55 | 3301 | 秋葉の森総合公園整備事業(再掲3章3節) | 54 | | | |
| 4403 | 市政総合案内「さいたまコールセンター」の開設 | 56 | 3106 | 情報教育の充実(再掲3章1節) | 55 | | | |
| 4404 | 電子入札の導入の推進 | 56 | | | | | | |

同一章内に再掲される事業(再掲分の記載は省略)

第5章 産業・経済の分野（28事業）

| 「達成」(★★★)とした事業【15事業】 | | | 「一定の成果あり」(★★)とした事業【8事業】 | | | 「未達成」(★)とした事業【5事業】 | | |
|----------------------|--------------------------------------|-------|-------------------------|---------------------------------|-------|--------------------|-----------------------|----|
| 番号 | 事業の名称 | 頁 | 番号 | 事業の名称 | 頁 | 番号 | 事業の名称 | 頁 |
| 5101 | 21世紀型産業の育成 | 57 | 5102 | 新事業創出事業 | 57 | 5201 | 商店街コミュニティサポート事業 | 59 |
| 5103 | 戦略的企業誘致の促進 | 58 | 5104 | 商工見本市の開催(再掲5章3節) | 58・63 | 3401 | 盆栽文化の振興・活用(再掲3章4節) | 60 |
| 5105 | 企業活動の国際化推進事業 | 58 | 5203 | コンベンション事業の推進(再掲7章1節) | 59 | 3407 | (仮)岩槻人形会館整備事業(再掲3章4節) | 60 |
| 4131 | 中心市街地活性化事業の推進(再掲4章1節) | 59 | 5204 | さいたま市民まつりの開催(再掲7章3節) | 60 | 5208 | 都市農業の充実 | 62 |
| 5202 | 中小企業支援機関との連携(再掲5章3節) | 59・66 | 5205 | 地産地消事業の展開 | 61 | 5304 | 勤労者福祉サービスセンターの充実 | 65 |
| 3404 | 鉄道博物館の整備促進(再掲3章4節) | 60 | 5302 | 起業家支援事業の推進 | 63 | | | |
| 5206 | 農業生産基盤整備の推進 | 61 | 2204 | ファミリー・サポート・センターの充実(再掲2章2節、7章2節) | 64 | | | |
| 5207 | 農業振興地域整備計画全体見直し事業 | 61 | | | | | | |
| 5209 | 観光資源の充実・整備事業 | 62 | | | | | | |
| 5301 | 産学官連携推進事業 | 63 | | | | | | |
| 2407 | 障害者就労支援事業(再掲2章4節) | 64 | | | | | | |
| 2301 | シルバー人材センターの充実・シルバーバンク事業(再掲2章3節、7章3節) | 65 | | | | | | |
| 5303 | 就労支援体制の整備 | 65 | | | | | | |
| 5305 | 伝統産業活性化事業 | 66 | | | | | | |

 同一章内に再掲される事業(再掲分の記載は省略)

第6章 安全・生活基盤の分野（33事業）

| 「達成」(★★★)とした事業【19事業】 | | | 「一定の成果あり」(★★)とした事業【11事業】 | | | 「未達成」(★)とした事業【3事業】 | | |
|----------------------|--|----|--------------------------|---|----|--------------------|---------------------------|----|
| 番号 | 事業の名称 | 頁 | 番号 | 事業の名称 | 頁 | 番号 | 事業の名称 | 頁 |
| 4101-1 | 災害に強いまちづくりの推進(再掲4章1節) [災害に強いまちづくり計画の策定] | 67 | 4101-2 | 災害に強いまちづくりの推進(再掲4章1節) [市有建築物安全安心診断事業の推進] | 67 | 1203 | 高沼用水路整備事業(再掲1章2節) | 68 |
| 4208 | 橋りょう耐震補強及び落橋防止対策事業(再掲4章2節) | 67 | 6102 | 準用河川改修事業 | 68 | 6308 | 市営住宅建替事業 | 75 |
| 6101 | 防災体制の充実 | 67 | 6103 | 普通河川改修事業 | 68 | 2307 | 高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業(再掲2章3節) | 75 |
| 6105 | 警防体制高度化推進事業 | 68 | 6104 | 流域貯留浸透事業 | 68 | | | |
| 6106 | 消防署・所の整備 | 69 | 4210 | 歩道整備事業(再掲4章2節) | 70 | | | |
| 6201 | 交通安全施設設置事業 | 70 | 4211 | 交通渋滞解消事業(さいたまの道スムーズプラン)(再掲4章2節) | 70 | | | |
| 6202 | あんしん歩行エリアの整備 | 70 | 6303 | 下水道汚水事業 | 74 | | | |
| 6203 | 事故危険箇所緊急対策事業 | 70 | 6305 | 下水道合流緊急改善事業(水質対策) | 74 | | | |
| 6204 | 消費生活安全事業 | 71 | 6306 | 下水道雨水事業 | 75 | | | |
| 6205 | 地域・安心安全ネットの構築・充実 | 71 | 6307 | 下水道老朽管・中継ポンプ場整備更新 | 75 | | | |
| 3204 | 青少年の健全育成事業(再掲3章2節) | 72 | 6311 | 火葬場・周辺環境整備事業 | 76 | | | |
| 6206 | 防犯対策事業 | 72 | | | | | | |
| 6207 | 学校安全ネットワーク事業 | 73 | | | | | | |
| 6208 | 防犯・防災情報メールシステムの構築 | 73 | | | | | | |
| 6301 | 上水道老朽管・浄配水場整備更新事業 | 74 | | | | | | |
| 6302 | 上水道施設耐震化事業 | 74 | | | | | | |
| 6304 | 下水道合流改善事業(浸水対策) | 74 | | | | | | |
| 6309 | (仮)市営春野団地建設事業 | 75 | | | | | | |
| 6312 | 葬祭施設・墓地・納骨堂の整備 | 76 | | | | | | |

第7章 交流・コミュニティの分野（22事業）

| 「達成」(★★★)とした事業【13事業】 | | | 「一定の成果あり」(★★)とした事業【9事業】 | | | 「未達成」(★)とした事業【0事業】 | | |
|----------------------|--------------------------------------|----|-------------------------|---------------------------------|----|--------------------|-------|---|
| 番号 | 事業の名称 | 頁 | 番号 | 事業の名称 | 頁 | 番号 | 事業の名称 | 頁 |
| 3303 | 国際スポーツイベントの開催支援・招致(再掲3章3節) | 77 | 5203 | コンベンション事業の推進(再掲5章2節) | 77 | | | |
| 7101 | 国際交流センター整備事業 | 78 | 3307 | さいたまシティカップ開催事業(再掲3章3節) | 77 | | | |
| 3305 | さいたま・たていわ親善ツアーデーの開催(再掲3章3節) | 78 | 7102 | 姉妹・友好都市交流の推進 | 78 | | | |
| 7104 | 世界の恒久平和に貢献する国際理解の推進 | 79 | 7103 | 人権啓発と人権教育の推進 | 79 | | | |
| 7105 | 国際化推進事業 | 80 | 3105 | 国際理解教育・交流事業(再掲3章1節) | 79 | | | |
| 7202 | 男女の人権に対する意識の啓発 | 81 | 7201 | 男女共同参画施策の推進 | 81 | | | |
| 7203 | 男女共同参画推進基盤の充実 | 81 | 7204 | 苦情の申出・処理制度の充実 | 81 | | | |
| 7205 | 政策・方針決定の場への男女共同参画の推進 | 82 | 2204 | ファミリー・サポート・センターの充実(再掲2章2節、5章3節) | 82 | | | |
| 7301 | 市民活動団体等支援事業 | 83 | 5204 | さいたま市民まつりの開催(再掲5章2節) | 83 | | | |
| 2301 | シルバー人材センターの充実・シルバーバンク事業(再掲2章3節、5章3節) | 84 | | | | | | |
| 7302 | (仮)市民活動サポートセンターの整備 | 84 | | | | | | |
| 7303 | プラザノース整備事業 | 85 | | | | | | |
| 7304 | (仮)片柳地区複合公共施設建設事業 | 85 | | | | | | |

(3)「未達成」と判定した事業(29事業)とその理由

| 章 | 番号 | 事業の名称 | 主な理由 | 新実施計画での対応 | 頁 |
|----------------------------|------|---------------------------|--|-----------|----|
| 第1章 (5事業) 環境・アメニティの分野 | 1109 | 環境教育・学習の推進 (再掲3章1節) | 「リサイクル活動実施校」「環境美化活動実施校」の割合が計画目標に達せず、また計画目標である「総合的方針・計画」の策定に至らなかったため。 | 継続 | 5 |
| | 1201 | 自然緑地の保全・整備事業 | 土地所有者の高齢化が進み、相続等による指定解除の増加から、指定面積率が微増に留まり、計画目標に達しなかったため。 | 継続 | 6 |
| | 1203 | 高沼用水路整備事業 (再掲6章1節) | 基本計画の策定を行い懸案箇所の検討を進めましたが、実施計画の策定ができず、計画目標である期間内の事業化には至らなかったため。 | 継続 | 6 |
| | 1204 | 加田屋地区自然環境公園整備事業 | 当該地は農業振興地域であるとともに、集団優良農地であり、市としての農業施策等を考慮し検討する必要があることから、解決に時間を要し、計画目標である期間内の事業推進には至らなかったため。 | 継続 | 6 |
| | 1209 | 緑の核づくり公園整備事業 (再掲4章3節) | 市有未利用地の活用や買収以外での用地の確保に努めるとともに、国庫補助事業などを積極的に導入する等、効率的な公園整備を行ったが、市民一人あたりの都市公園面積が計画目標に達しなかったため。 | 継続 | 8 |
| 第2章 (3事業) 健康・福祉の分野 | 2205 | 児童センター整備事業 | 土地所有者との交渉等の諸事情により、用地取得が遅れ施設整備に遅延が生じるなど、施設数が計画目標に達しなかったため。 | 継続 | 13 |
| | 2307 | 高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業(再掲6章3節) | 既認定住宅の入居者募集の低迷から新規供給を見合わせたことにより、供給戸数が計画目標に達しなかったため。 | 継続 | 17 |
| | 2504 | 市立病院機能の再整備事業 | 県の保健医療計画の変更や新病院の開設など、市立病院をとりまく環境が変化したことを踏まえ、改めて適正な機能・役割を検討するとしたことにより、計画目標である期間内のマスタープラン策定には至らなかったため。 | 継続 | 21 |
| 第3章 (3事業) 教育・文化・スポーツの分野 | 1109 | 環境教育・学習の推進 (再掲1章1節) | 「リサイクル活動実施校」「環境美化活動実施校」の割合が計画目標に達せず、また計画目標である「総合的方針・計画」の策定に至らなかったため。 | 継続 | 24 |
| | 3401 | 盆栽文化の振興・活用 (再掲5章2節) | 盆栽関連施設等基本計画の策定に時間を要し、盆栽関連施設(大宮盆栽美術館)の開館が遅れが生じたことなどにより、盆栽村来訪者数が計画目標に達しなかったため。 | 継続 | 35 |
| | 3407 | (仮)岩槻人形会館整備事業 (再掲5章2節) | 事業用地の選定が遅れが生じ、計画目標である期間内の完成には至らなかったため。 | 継続 | 36 |

| 章 | 番号 | 事業の名称 | 主な理由 | 新実施計画での対応 | 頁 |
|-------------------------|------|------------------------------|--|---------------------------------------|----|
| 第4章（10事業） 都市基盤・交通の分野 | 4107 | 大宮駅東口駅前地区整備推進事業 | 駅前広場北側で予定した街路事業につきましては、広場計画にかかる権利者の合意が得られず、また、駅前広場南側では地元まちづくり団体との協働により、市街地再開発事業の事業化を目指して取組んだが、権利者の合意できる事業フレームが計画目標内で提供できず、事業化には至らなかったため。 | 継続 | 39 |
| | 4110 | 大宮駅西口整備推進事業 | まちづくり団体である「大宮駅西口タウン会議」が平成 19 年に発足するなど、第三地区において、まちづくりの機運が高まってきてはいるものの、計画目標である期間内における事業化には至らなかったため。 | 継続 | 40 |
| | 4115 | 浦和駅周辺鉄道高架化事業 | 用地交渉が難航したことや乗降客に対する一層の安全対策を実施したことにより、事業認可期間を平成 24 年度までに延長するなど、当初の事業計画に対し、遅れが生じたため。 | 継続 | 42 |
| | 4119 | 武蔵浦和駅第 7-1 街区整備事業 | 方針の検討及び関係所管との協議を重ね、平成 21 年度以降の整備方針の具体化の目的をたてたが、計画目標である期間内の整備方針の具体化による事業の推進に至らなかったため。 | 継続 | 43 |
| | 4124 | 江川土地区画整理事業 | 調節池の工事遅延により換地処分の年度を平成 27 年度とするなど事業に遅れが生じており、進捗率が計画目標に至らなかったため。 | 継続 | 44 |
| | 4125 | 南平野土地区画整理事業 | 一部地権者との調整に時間を要し、換地処分の実施に至らなかったことから、事業を平成 23 年度までとする計画変更を行い、計画目標である期間内の完成には至らなかったため。 | 継続 | 44 |
| | 4127 | 指扇駅周辺の整備促進 | 用地買収の遅れなどにより事業進捗に遅れが生じ、計画目標である期間内の完成には至らなかったため。 | 継続 | 45 |
| | 4221 | 駅前広場改修事業 | 大宮駅西口の駅前広場の交通の円滑化・バリアフリー化に向けて、関係機関と協議及び検討を行ったが、整備方針の合意形成に至らず、計画目標である事業化には至らなかったため。 | 継続 | 53 |
| | 1209 | 緑の核づくり公園整備事業 (再掲 1 章 2 節) | 市有未利用地の活用や買収以外での用地の確保に努めるとともに、国庫補助事業などを積極的に導入する等、効率的な公園整備を行ったが、市民一人あたりの都市公園面積が計画目標に達しなかったため。 | 継続 | 54 |
| | 4405 | 電子投票システムの導入 | 本システムの導入は、全国的・長期的な課題であることから、平成 19 年度で検討を中断しており、計画目標である事業推進には至らなかったため。 | 位置づけなし(全国的に長期的課題であり、今後 5 年での導入は難しいため) | 56 |

| 章 | 番号 | 事業の名称 | 主な理由 | 新実施計画での対応 | 頁 |
|--------------------------|------|---------------------------|--|---------------------------|----|
| 第5章（5事業） 産業・経済の分野 | 5201 | 商店街コミュニティサポート事業 | 本事業活用のPRを(財)さいたま市産業創造財団を通じて行ったが、実施商店街数が計画目標に至らなかったため。 | 位置づけなし(本事業は他事業に吸収再編されたため) | 59 |
| | 3401 | 盆栽文化の振興・活用 (再掲3章4節) | 盆栽関連施設等基本計画の策定に時間を要し、盆栽関連施設(大宮盆栽美術館)の開館に遅れが生じたことなどにより、盆栽村来訪者数が計画目標に達しなかったため。 | 継続 | 60 |
| | 3407 | (仮)岩槻人形会館整備事業 (再掲3章4節) | 事業用地の選定に遅れが生じ、計画目標である期間内の完成には至らなかったため。 | 継続 | 60 |
| | 5208 | 都市農業の充実 | 農業従事者の増加に向け、講習会の開催や認定農業者制度の周知などを行ったが、農業者の高齢化や後継者不足などにより、認定農業者数が計画目標に至らなかったため。 | 継続 | 62 |
| | 5304 | 勤労者福祉サービスセンターの充実 | 退職による退会を防止するための新制度の創設や中堅企業に対する勧誘強化等の加入促進策を行ったが、経済状況の低迷に伴う事業所の加入意欲の減退や加入所数の減少が生じ、会員数が計画目標に至らなかったため。 | 継続 | 65 |
| 第6章（3事業） 安全・生活基盤の分野 | 1203 | 高沼用水路整備事業 (再掲1章2節) | 基本計画の策定を行い懸案箇所の検討を進めたが、実施計画の策定ができず、計画目標である計画期間内の事業化には至らなかったため。 | 継続 | 68 |
| | 6308 | 市営住宅建替事業 | 昭和40年代に建設された市営住宅の建替えを中心に検討を行い、建替え計画の策定に向けた調査を行ったが、計画の策定ができず、計画目標である計画期間内の事業化には至らなかったため。 | 継続 | 75 |
| | 2307 | 高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業(再掲2章3節) | 既認定住宅の入居者募集の低迷から新規供給を見合わせたことにより、供給戸数が計画目標に達しなかったため。 | 継続 | 75 |
| 第7章（0事業） 交流・コミュニティの分野 | | | | | |

※各事業の詳細は、「総合振興計画実施計画事業（平成17～20年度）の実績及び達成状況一覧表」をご覧ください。


(4) 希望のまちづくり事業の達成状況

希望のまちづくり事業とは、3つの将来都市像の実現に向け、各行政分野における個別の具体的な事業の中から、基本計画「第2部 さいたま市らしさを生み出す都市づくり」に示す「都市づくりのポイント」を踏まえて、特にさいたま市らしさや新しい都市イメージを生み出すための代表的な事業を掲載し、これら事業間の連携、協調を図りながら推進することで、より効果的に将来都市像実現に貢献するものを、分野横断的に掲げたものです。

これら事業の達成状況は、達成「★★★」が44.0%、一定の成果あり「★★」が42.0%、未達成「★」が14.0%でした。


3つの将来都市像

- 多彩な都市活動が展開される東日本の『交流拠点都市』
- 見沼の緑と荒川の水に象徴される『環境共生都市』
- 若い力の育つゆとりある『生活文化都市』

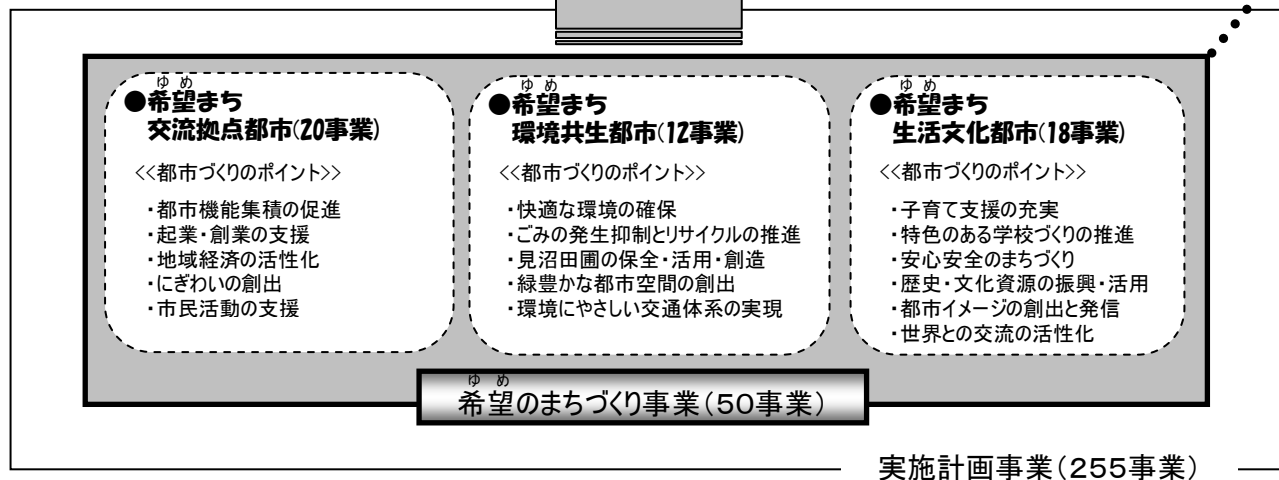

| | 達成 (★★★) | 一定の 成果あり (★★) | 未達成 (★) |
|------------------|-------------|---------------------|------------|
| 交流拠点都市 (20事業) | 10 | 7 | 3 |
| 環境共生都市 (12事業) | 4 | 6 | 2 |
| 生活文化都市 (18事業) | 8 | 8 | 2 |
| 計(50事業) | 22 | 21 | 7 |
| 割合 | 44.0% | 42.0% | 14.0% |

また、将来都市像別に見た達成状況（達成「★★★」と一定の成果あり「★★」の合計）は、交流拠点都市が85.0%、環境共生都市が83.3%、生活文化都市が88.8%でした。

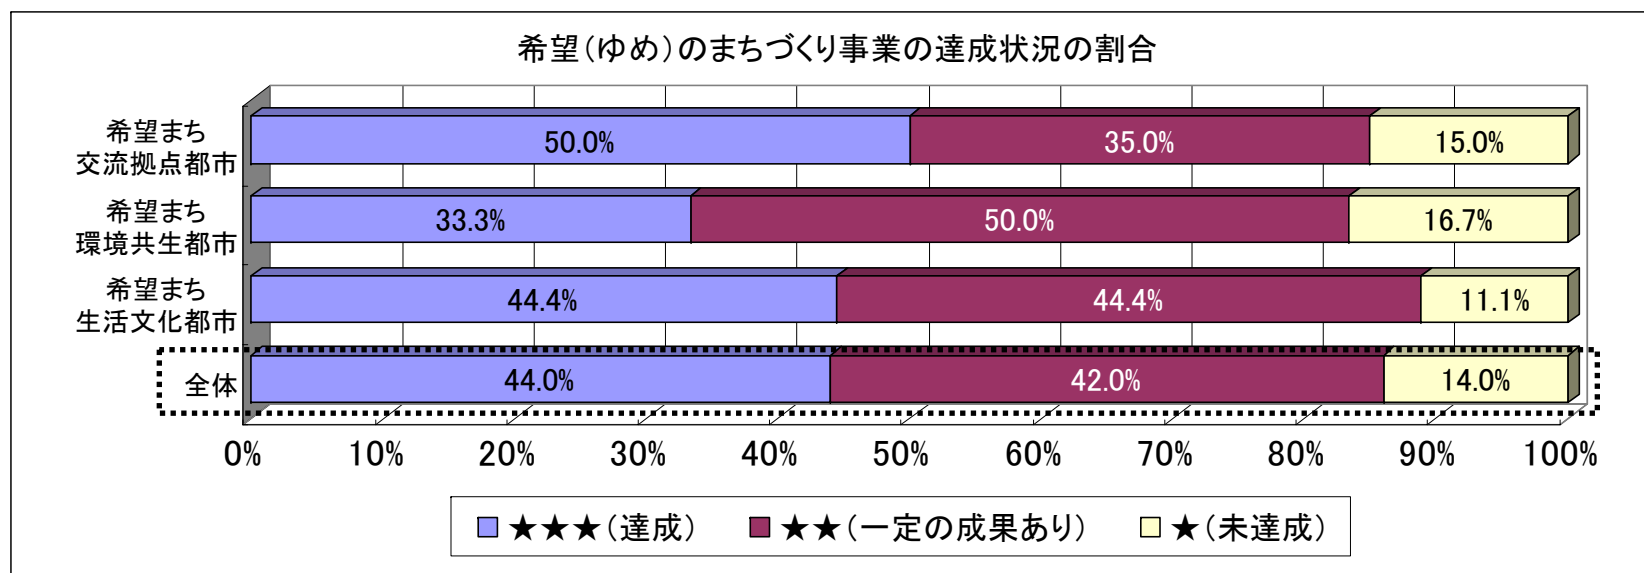

① 希望まち 交流拠点都市

□ 希望のまちづくり事業及び達成状況一覧

| 希望(ゆめ)のまちづくり事業 | | 達成状況 | 頁 |
|----------------------|----------------------|------|----|
| 都市機能集積の促進 | | | |
| 大宮駅周辺・さいたま新都心周辺地区の整備 | | | |
| 3402 | 氷川参道の整備 | ★★ | 35 |
| 4106 | 大宮駅東口都市再生プラン推進事業 | ★★ | 39 |
| 4107 | 大宮駅東口駅前地区整備推進事業 | ★ | 39 |
| 4108 | まちづくり支援事業(大宮駅周辺地区) | ★★★★ | 40 |
| 4109 | 複合交通拠点整備推進事業 | ★★ | 40 |
| 4110 | 大宮駅西口整備推進事業 | ★ | 40 |
| 4111 | 大宮駅西口第四土地地区画整理事業 | ★★★★ | 40 |
| 4112 | さいたま新都心にぎわい創出事業 | ★★ | 41 |
| 浦和駅周辺地区の整備 | | | |
| 4113 | 浦和駅東口駅前地区第二種市街地再開発事業 | ★★★★ | 41 |
| 4114 | 浦和駅西口南地区市街地再開発事業 | ★★★★ | 41 |
| 4115 | 浦和駅周辺鉄道高架化事業 | ★ | 42 |

| 希望(ゆめ)のまちづくり事業 | | 達成状況 | 頁 |
|----------------|--------------------|------|----|
| 起業・創業の支援 | | | |
| 5102 | 新事業創出事業 | ★★ | 57 |
| 5302 | 起業家支援事業の推進 | ★★ | 63 |
| 地域経済の活性化 | | | |
| 5103 | 戦略的企業誘致の促進 | ★★★★ | 58 |
| 5203 | コンベンション事業の推進 | ★★ | 59 |
| 5305 | 伝統産業活性化事業 | ★★★★ | 66 |
| にぎわいの創出 | | | |
| 3404 | 鉄道博物館の整備促進 | ★★★★ | 60 |
| 5209 | 観光資源の充実・整備事業 | ★★★★ | 62 |
| 市民活動の支援 | | | |
| 7301 | 市民活動団体等支援事業 | ★★★★ | 83 |
| 7302 | (仮)市民活動サポートセンターの整備 | ★★★★ | 84 |

※各事業の実績は、「総合振興計画実施計画事業（平成17～20年度）の実績及び達成状況一覧表」をご覧ください。

□ 主な成果

3402 氷川参道の整備

大宮中央通線以南の区間(1,080m)において、歩行者空間の確保に必要な歩車分離整備に取り組み、平成19年3月に南区間380mの歩車分離整備が完了しました。



氷川参道南区間の歩車分離

4113 浦和駅東口駅前地区第二種市街地再開発事業 7302 (仮)市民活動サポートセンターの整備

平成19年10月に、複合公共施設であるコムナーレやキーテナントである浦和パルコが入居する施設建築物の竣工及び公共地下駐車場や市民広場などの供用を開始しました。

複合公共施設コムナーレ9階に、市民活動を支援し、その活性化を図るための拠点として、市民活動サポートセンターを開設しました。



浦和駅東口における商業施設や複合公共施設コムナーレの開設

5103 戦略的企業誘致の促進

平成17年7月から平成19年度末までの企業誘致活動第I期において、目標を大きく上回る38社の立地を達成しました。

また、平成20年度から平成22年度までの3年間を企業誘致活動第II期と定め、新たに30社の立地を目標とし、平成21年3月末までに16社の立地が決定しました。



平成20年5月に操業を開始した「カルソニックカンセイ株式会社」



平成21年2月にすべての商品開発を行う研究棟及び工場の建設が決定した「株式会社ロッテ」

3404 鉄道博物館の整備促進

平成19年10月14日に鉄道博物館が開館しました。

平成21年3月末現在で、来館者数は240万人を超えています。



鉄道博物館の開館

② 希望^{ゆめ}まち 環境共生都市

□ 希望^{ゆめ}のまちづくり事業及び達成状況一覧

| 希望(ゆめ)のまちづくり事業 | | 達成状況 | 頁 |
|------------------|-----------------|------|---|
| 快適な環境の確保 | | | |
| 1102 | 環境保全政策推進事業 | ★★★ | 1 |
| 1103 | 地球温暖化防止推進事業 | ★★ | 2 |
| 1107 | 低公害車普及促進対策事業 | ★★ | 4 |
| 1109 | 環境教育・学習の推進 | ★ | 5 |
| ごみの発生抑制とリサイクルの推進 | | | |
| 1104 | ごみ減量・リサイクル推進事業 | ★★ | 3 |
| 見沼田圃の保全・活用・創造 | | | |
| 1206 | 見沼グリーンプロジェクトの推進 | ★★ | 7 |
| 1207 | (仮)セントラルパーク整備事業 | ★★★ | 7 |

| 希望(ゆめ)のまちづくり事業 | | 達成状況 | 頁 |
|----------------|---------------------|------|----|
| 緑豊かな都市空間の創出 | | | |
| 4301 | 緑化推進事業 | ★★★ | 54 |
| 1209 | 緑の核づくり公園整備事業 | ★ | 54 |
| 環境にやさしい交通体系の実現 | | | |
| 4219 | 市内路線バス・コミュニティバス整備事業 | ★★ | 52 |
| 4220 | 駐車場・自転車駐車場の整備事業 | ★★★ | 52 |
| 4201 | 総合都市交通体系の確立 | ★★ | 48 |

※各事業の実績は、「総合振興計画実施計画事業（平成 17～20 年度）の実績及び達成状況一覧表」をご覧ください。

□ 主な成果

1102 環境保全政策推進事業

環境への負荷の低減を図るための措置と公害等の発生源に対する規制を定めた「さいたま市生活環境の保全に関する条例」を平成 20 年 10 月に制定しました。また、平成 21 年 3 月までに、全区役所で ISO14001 認証を取得しました。

1107 低公害車普及促進対策事業

4219 市内路線バス・コミュニティバス整備事業

平成 17 年 6 月から「天然ガス自動車普及促進モデル事業」に取り組み、普及促進を行っています。天然ガス自動車、ハイブリット車などの低公害車を公用車に導入し、導入率は 11.9%(平成 20 年度末)に達しました。

また、コミュニティバスを北区(平成 17 年度)、岩槻区(平成 18 年度)に開設し、全 6 路線で圧縮天然ガスを燃料とするバスを導入しました。



市公用車への低公害車の導入



コミュニティバス新路線導入

1207 (仮)セントラルパーク整備事業

本市では、見沼田圃の原風景を将来に残す「セントラルパーク基本構想」を推進しています。その先駆けとなる合併記念見沼公園を平成 19 年 11 月に開設しました。



合併記念見沼公園の開設

4301 緑化推進事業

緑化対象を屋上から壁面までと広げて、建築物全体の緑化を推進する「建築物緑化推進制度」を平成 20 年 3 月に創設しました。

平成 20 年 7 月からは、建築物の屋上や壁面の緑化にかかる経費を助成する「建築物緑化助成事業」を実施するとともに、緑化指導基準の一部を改正し、建築物緑化を推進しています。

また、公共施設においても、さいたま市民医療センターやつばさ小学校の屋上を緑化しました。



市民医療センターの屋上緑化

③ 希望まち 生活文化都市

□ 希望のまちづくり事業及び達成状況一覧

| 希望(ゆめ)のまちづくり事業 | | 達成状況 | 頁 |
|----------------|--------------------|------|----|
| 子育て支援の充実 | | | |
| 2202 | 子育て支援ネットワーク事業 | ★★ | 12 |
| 2207 | 保育所の新設整備事業 | ★★ | 14 |
| 2204 | ファミリー・サポート・センターの充実 | ★★ | 13 |
| 2211 | 小児救急医療体制の充実・強化 | ★★★ | 15 |
| 特色のある学校づくりの推進 | | | |
| 3102 | 特色のある学校づくり推進事業 | ★★★ | 24 |
| 3103 | 小・中一貫「潤いの時間」の展開 | ★★★ | 25 |
| 3113 | 中高一貫教育の推進 | ★★★ | 29 |
| 安心安全のまちづくり | | | |
| 災害に強いまちづくりの推進 | | | |
| 4101-1 | 災害に強いまちづくり計画の策定 | ★★★ | 67 |
| 4101-2 | 市有建築物安全安心診断事業の推進 | ★★ | 67 |
| 6205 | 地域・安心安全ネットの構築・充実 | ★★★ | 71 |
| 6207 | 学校安全ネットワーク事業 | ★★★ | 73 |

| 希望(ゆめ)のまちづくり事業 | | 達成状況 | 頁 |
|----------------|----------------|------|----|
| 歴史・文化資源の振興・活用 | | | |
| 3401 | 盆栽文化の振興・活用 | ★ | 35 |
| 3407 | (仮)岩槻人形会館整備事業 | ★ | 36 |
| 都市イメージの創出と発信 | | | |
| 3307 | さいたまシティカップ開催事業 | ★★ | 33 |
| 5204 | さいたま市民まつりの開催 | ★★ | 60 |
| 世界との交流の活性化 | | | |
| 3105 | 国際理解教育・交流事業 | ★★ | 26 |
| 7105 | 国際化推進事業 | ★★★ | 80 |
| 7102 | 姉妹・友好都市交流の推進 | ★★ | 78 |

※各事業の実績は、「総合振興計画実施計画事業（平成17～20年度）の実績及び達成状況一覧表」をご覧ください。

□ 主な成果

2211 小児救急医療体制の充実・強化

平成 19 年 6 月には小児救急電話相談(子ども急患電話相談)事業を、平成 20 年 1 月には医療情報システム(医療なび)の運用などを開始しました。

また、平成 20 年 10 月から自治医科大学附属さいたま医療センターでの周産期医療の実施、平成 21 年 3 月に開設したさいたま市民医療センターでの小児科第二次救急医療の実施及び小児科初期救急委託事業開始等により、周産期・小児救急医療体制を強化しました。



市民医療センターの開設

3113 中高一貫教育の推進

平成 19 年 4 月に、さいたま市で初めての併設型中高一貫教育校として、市立浦和高等学校内に浦和中学校を新設しました。



浦和中学校(併設型中高一貫教育校)の開校

6207 学校安全ネットワーク事業

政令指定都市では唯一、平成 18 年 1 月に全市立小学校 100 校と特別支援学校 1 校に警備員を配置し、学校への不審者侵入の防止、校舎等の巡回警備や登下校時の見守り活動など、子どもたちの安全確保に努めました。



全市立小学校・特別支援学校に警備員を配置

7105 国際化推進事業

平成 20 年 8 月に開催した国連軍縮会議を始め、平成 18 年から平成 20 年までの 3 年間で合わせて 4 つの国際会議を誘致・開催し、平成 19 年 8 月には、埼玉県内では初(全国 51 番目)の国際会議観光都市として認定されました。



第 20 回 国連軍縮会議 in さいたま

3 「都市経営の基本戦略取組状況」について

都市づくりにおいては、「何をやるか」に加えて「いかに進めるか」というアプローチの視点が重要です。そのため、実施計画書「第3編 都市経営の基本戦略」では、「市民と行政の協働」と「将来を見据えた行財政運営」を推進するための10のアプローチと、アプローチを具体化した94の手法を整理し、都市経営を進める上での基本戦略として示しています。

これらのアプローチ・手法を踏まえて取り組んだ課室数（延べ数）は、404（前年より1増）でした。

4年間を通して、アプローチ1「協働の仕組みづくり・具体化」、アプローチ3「市民活動の支援」、アプローチ7「健全な行財政運営」に関して取り組んだ課室数が大きく増加し、アプローチ8「公共施設の適正配置」に関して取り組んだ課室数は、ハードからソフトに移行する時代背景を反映し、減少しました。

| 10のアプローチ | | 主な手法 | 取り組んだ課室数(延べ数) | | | |
|----------|----------------|--|---------------|--------|--------|--------|
| | | | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 |
| 1 | 協働の仕組みづくり・具体化 | 協働の仕組みづくり・機会づくり、協働による事業の推進 など | 60 | 95 | 149 | 167 |
| 2 | 市民との情報共有 | 広報の充実、意見交換の機会の充実 など | 34 | 33 | 38 | 35 |
| 3 | 市民活動の支援 | 市民活動の場の充実、市民活動の支援、市民活動の相互交流とネットワーク化の促進、自治会活動の活性化、企業市民による社会貢献活動の促進 など | 22 | 33 | 48 | 47 |
| 4 | 効率的な組織・機構の整備 | 都市経営戦略会議の設置・運営、組織体制の改革、外郭団体のあり方の検討 など | 9 | 8 | 10 | 8 |
| 5 | 職員の意識改革と能力開発 | 職員の意識改革、職員の能力開発 など | 13 | 17 | 19 | 21 |
| 6 | 行政評価システムの構築と運用 | 行政評価システムの構築と運用、市民との協働による行政評価 など | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 7 | 健全な行財政運営 | 歳入の確保、歳出の抑制、(仮)健全財政維持プランの策定、未利用市有地の有効活用、電子市役所の構築、民間活力の有効活用 など | 30 | 43 | 64 | 62 |
| 8 | 公共施設の適正配置 | ソフト面の充実、施設の有効活用、公共施設の新規整備の重点化 など | 19 | 42 | 25 | 15 |
| 9 | 行政区の機能充実 | 区まちづくり予算の有効活用、区役所の権限の拡大、区民会議の充実 など | 34 | 30 | 35 | 34 |
| 10 | 政令指定都市としての広域行政 | 八都府市首脳会議などとの連携による広域的課題への具体的な調査・対応などの推進など | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 合計 | | | 233 | 316 | 403 | 404 |

4 「総合振興計画実施計画事業（平成 17～20 年度）の実績及び達成状況一覧表」について

事業ごとに、「4 年間の実績」、「達成状況」、「新実施計画での対応」を記載しています。

(1) 4 年間の実績

4 年間の実績及び事業内容を記載しています。

また、事業実施において、取り入れたアプローチ及び手法がある場合は、「[取り入れた第 3 編の手法]」として記載しています。

(2) 達成状況

平成 20 年度末計画目標に対する事業の達成状況について、次の 3 段階で判定しています。

| | 状況 | 概要 | 合計数(全 255 事業の内訳) |
|---|---------------|-------------------------|------------------|
| ① | 達成 ★★★ | 平成 20 年度末の計画目標を概ね達成したもの | 132 事業 |
| ② | 一定の成果あり ★★ | ①に達しないが、概ね7割以上を達したもの | 94 事業 |
| ③ | 未達成 ★ | ②に達していないもの | 29 事業 |

(3) 新実施計画での対応

当該事業の新実施計画における位置づけや継続性について、次の 3 つの区分で記載しています。

| | 対応 | 概要 | 合計数(全 255 事業の内訳) |
|---|--------|-------------------------------|---|
| ① | 継続 | 新実施計画で引き続き位置づけている事業(一部変更分も含む) | 220 事業 |
| ② | 完了 | 実施計画で完了しているものとして扱っている事業 | 32 事業 |
| ③ | 位置づけなし | 「完了」していないが、新実施計画に位置づけていない事業 | 3 事業 (1208 七里総合公園整備事業 7 頁 4405 電子投票システムの導入 56 頁 5201 商店街コミュニティサポート事業 59 頁) |

総合振興計画実施計画事業（平成 17～20 年度）

の実績及び達成状況一覧表

